

Relatório de Execução Trimestral – 2ºT.2025

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2025	jun-2025	jun-2024	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4.475.758	3.346.524	3.183.637	162.887
Propriedades de investimento		538.521	324.642	213.879
Ativos intangíveis	2.410.033.295	2.090.398.763	1.949.494.710	140.904.054
Participações financeiras	2.439.317	2.670.977	2.478.317	192.660
Subtotal	2.416.948.369	2.096.954.786	1.955.481.306	141.473.480
Ativo corrente				
Clientes, contribuintes e utentes	5.704.129	1.218.627	1.820.955	-602.328
Estado e outros entes públicos	8.812.061	6.209.299	5.289.011	920.288
Acionistas		0	0	0
Outras contas a receber	44.440.971	11.332.138	6.432.937	4.899.201
Diferimentos	42.196	27.202	43.543	-16.341
Outros ativos financeiros	31.755.718	0	23.614.032	-23.614.032
Ativos não correntes detidos para venda	315.475	0	0	0
Caixa e Depósitos	13.210.270	94.493.546	75.659.651	18.833.895
Subtotal	104.280.820	113.280.813	112.860.129	420.683
Total do ativo	2.521.229.190	2.210.235.598	2.068.341.435	141.894.163
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	711.576.980	639.270.452	497.006.899	142.263.553
Outros instrumentos de capital próprio	241.933	241.933	241.933	0
Resultados transitados	-90.852.096	-67.296.060	-50.328.288	-16.967.772
Ajustamentos em ativos financeiros	3.480.721	-330.290	569.751	-900.041
Subsídios ao investimento	1.382.663.479	1.008.913.825	857.331.063	151.582.761
Outras variações no património líquido	36.934.066	0	13.327.855	-13.327.855
Resultado líquido do período	-43.772.435	-20.025.844	-22.291.017	2.265.173
Total do património líquido	2.000.272.648	1.560.774.016	1.295.858.197	264.915.819
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	452.980.942	496.433.789	497.980.081	-1.546.291
Financiamentos obtidos	39.740.339	118.913.032	124.021.728	-5.108.697
Outras contas a pagar	0	392.791	369.505	23.285
Subtotal	492.721.281	615.739.612	622.371.315	-6.631.703
Passivo corrente				
Fornecedores	6.569.419	4.209.738	29.827.103	-25.617.365
Fornecedores de investimentos	11.592.322	18.493.342	2.037.430	16.455.912
Estado e outros entes públicos	0	343.686	504.592	-160.905
Financiamentos obtidos	4.295.474	1.826.225	112.976.113	-111.149.889
Outras contas a pagar	5.496.656	5.707.424	4.485.294	1.222.130
Diferimentos	0	3.141.555	0	3.141.555
Outros passivos financeiros	281.391	0	281.391	-281.391
Subtotal	28.235.261	33.721.970	150.111.923	-116.389.953
Total do passivo	520.956.542	649.461.582	772.483.238	-123.021.656
Total do património líquido e passivo	2.521.229.190	2.210.235.598	2.068.341.435	141.894.163


Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a jun 2025	jan a jun-2025	jan a jun-2024	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	217.654.646	76.800.736	70.826.655	5.974.081
Serviços prestados (transporte)	37.257.555	31.949.328	27.464.742	4.484.585
Outras vendas e serviços prestados	1.604.017	753.064	1.297.402	-544.339
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	991.975	993.276	1.478.899	-485.623
Trabalhos para a própria entidade		-6.198.831	0	-6.198.831
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-217.654.646	-76.800.736	-70.826.655	-5.974.081
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-24.911.392	-22.785.048	-20.620.383	-2.164.665
Outros fornecimentos e serviços externos	-6.073.021	-3.862.415	-3.185.365	-677.050
Gastos com o pessoal	-3.322.701	-3.197.451	-2.874.002	-323.449
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0
Provisões líquidas	0	0	0	0
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	0	173.128	0	173.128
Outros rendimentos e ganhos	17.847.355	9.583.397	9.113.254	470.143
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-10.000	0	0	0
Outros gastos e perdas	-330.789	5.950.483	-210.497	6.160.980
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	23.052.999	13.358.931	12.464.051	894.880
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-39.038.966	-31.346.796	-29.851.035	-1.495.761
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-15.985.967	-17.987.865	-17.386.984	-600.881
Juros e rendimentos similares obtidos	0	12.620	24.030	-11.410
Juros e gastos similares suportados	-2.549.456	-2.050.599	-4.928.063	2.877.464
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	-18.535.424	-20.025.844	-22.291.017	2.265.173
Imposto sobre o rendimento	-1.727.340	0	0	0
Resultado líquido do período	-20.262.764	-20.025.844	-22.291.017	2.265.173

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2025	jan a jun-2025	jan a jun-2024	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	84.913.087	39.798.496	37.814.390	1.984.106
Pagamentos a fornecedores	-77.842.688	-44.359.813	-32.306.723	-12.053.090
Pagamentos ao pessoal	-6.558.749	-2.997.290	-2.714.306	-282.984
Caixa gerada pelas operações	511.650	-7.558.607	2.793.362	-10.351.968
Outros recebimentos/pagamentos	27.243.592	347.735	3.849.834	-3.502.099
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3.452.746	6.722.018	0	6.722.018
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	24.302.496	-488.854	6.643.196	-7.132.050
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-1.771.607	-58.770	-179.090	120.321
<i>Ativos intangíveis</i>	-411.482.805	-58.902.314	-70.737.131	11.834.817
<i>Investimentos financeiros</i>	-35.001.000	0	0	0
Recebimentos provenientes de:				
<i>Investimentos financeiros</i>	0	98.300.000	112.635.299	-14.335.299
<i>Subsídios ao investimento</i>	354.037.950	49.324.344	21.067.806	28.256.538
<i>Dividendos</i>	0	0	1.835.297	-1.835.297
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-94.217.463	88.663.261	65.759.369	22.903.892
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>	164.400.840	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Financiamentos obtidos</i>	-90.108.697	-3.858.697	-4.304.362	445.665
<i>Juros e gastos similares</i>	-4.377.176	-2.638.567	-5.648.821	3.010.254
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	69.914.966	-6.497.264	-9.953.183	3.455.919
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	0	81.677.142	62.449.381	19.227.761
Efeitos das diferenças de câmbio		0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.210.270	12.817.734	13.210.270	-392.536
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13.210.270	94.493.546	75.659.651	18.833.895

Prazo Médio de Pagamentos

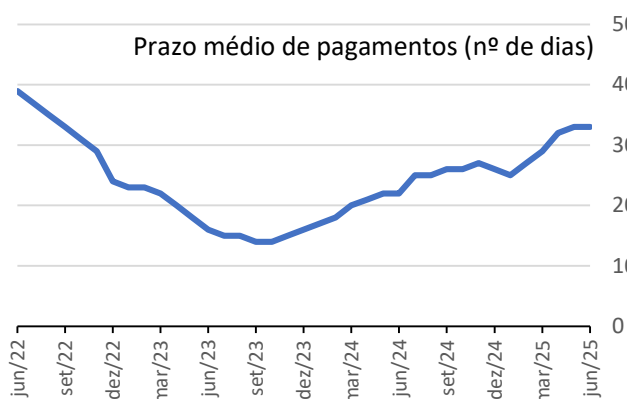

- Em junho de 2025, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 33 dias, valor que compara com 33 dias no mês anterior e com 22 dias em junho de 2024.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 2º trimestre de 2025, cifrou-se em 37 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de abril, uma execução de 28% face ao previsto no PAO 2025 e de 32% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
 - Para a execução orçamental da receita em 2025, até final de abril, contribuíram sobretudo os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 84,7 M€), o PRR (37,0 M€, incluindo o saldo transitado do ano anterior), a receita tarifária (18,0 M€), o Sustentável 2030 (11,8 M€), e o saldo da gerência anterior (11,5 M€).
 - Do lado da Despesa, a execução orçamental em 2025, até final de abril, representou cerca de 9% face ao PAO 2025, e 12% em relação ao Orçamento do Estado.
 - Em janeiro foi registada a cativação orçamental no valor global de 30,6 M€.
 - Foi realizado crédito especial pelo saldo transitado do PRR no valor de 13,6 M€ e registado em receita o saldo transitado proveniente de outras fontes de financiamento.
 - Em março foram realizados dois pedidos de alteração orçamental. Um relativo ao reforço de participação no Centro de Competências Ferroviário, que não obteve aprovação e outro relativo à aplicação do saldo transitado, no valor de 96,2 M€, que teve aprovação parcial pelo despacho N° 19/2025 do secretário de estado adjunto e do orçamento no valor de 10 M€ no mês de junho.
 - Em março foi também aprovado o pedido de descativação, cujo pedido tinha sido realizado a 7 de março, no montante total de 26,7M€.
 - Em maio foi realizado o terceiro pedido de alteração orçamental, relativo à Prorrogação da Subconcessão da Via Porto, no valor de 20 M€.
 - Em junho foi realizado o segundo pedido de descativação parcial, relativo a despesas com pessoal.
-

CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES

➤ A condicionalidade inerente à aprovação do Plano de Atividades da empresa para 2025 através do Despacho n.º 176/2025-SETF apresentava, em 30 de junho de 2025, a seguinte execução:

Condições de aprovação do PAO 2025	Limite aprovado	Execução até 30/junho
Gastos operacionais (milhares de euros)	68 989	28 646
Contratação de trabalhadores	7	0
Substituição de viaturas automóveis operacionais, em regime de AOV	1	0
Renovação da frota automóvel não operacional	27	23
Aquisição de viaturas automóveis operacionais	2	0

➤ No final do 2º trimestre de 2025, as 62 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2025 cujo horizonte de realização estava previsto para o 1º ou 2º trimestre apresentavam a seguinte distribuição:

- 13 atividades já concluídas;
- 28 atividades com atraso face ao previsto;
- 9 atividades canceladas ou adiadas;
- 12 atividades em relação às quais não foi possível obter informação.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------	---------------------------

LINHA ROSA / LINHA AMARELA

GPC	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento da Operação - Linha Rosa - Sustentável 2030	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistema de Sinalização no Parque Vila d' Este (Fase 2)	já está feito	
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Definição e Concursos Equipamentos. Vila d'Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DST	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Parque Fotovoltaico de Vila d'Este		cancelado/adiado
GASQ	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE-MM24_ Estação Liberdade/S. Bento e Estação Boavista/Casa da Música - Linha Rosa - Relatório		já está feito
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM34_ Estação Liberdade/S. Bento: Escavação Integral - Linha Rosa_Lóios - Aprovação do Relatório Final pela Tutela	devia estar feito mas não está	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM25_Rio da Vila/RECAPE_S. Domingos Relatório	devia estar feito mas não está	
GASQ	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_Hospital Santo António e Miguel Bombarda – Sondagens - Relatório	já está feito	
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_Estação Galiza- sondagens Arqueológicas - Linha Rosa - Relatório	já está feito	já está feito
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-PM5_ Intervenção Preventiva no Edifício Linha Rosa	devia estar feito mas não está	
GASQ	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3033-MM27_Escavação Arqueológica Quinta do Cisne		devia estar feito mas não está
GASQ	1º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM27_Escavação Arqueológica Quinta do Cisne Análises Paleoambientais Processamento / Análise de Ecofactos	devia estar feito mas não está	
GASQ	2º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM101_Publicação dos Trabalhos de Minimização Patrimonial		devia estar feito mas não está
GASQ	1º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM106_Mitigação Associada a Compensação Sobreiros	já está feito	
GASQ	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	DCAPE3032_EL14_Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa		
GASQ	2º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	DCAPE3032_EL14_Memória da Fonte da Natividade, Muralha Fernandina e Ponte S. Domingos - Linha Rosa		
GASQ	4º TRIMESTRE	Adjudicação	Implementação das Medidas de Autoproteção - Linha Rosa		
GASQ	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Pós Avaliação Ambiental - Fase de Construção e Exploração - Linha Rosa		
GCPE	2º TRIMESTRE	marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Início dos Testes Integrados Extensão da Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GCPE	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Início da Operação Comercial da Extensão da Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Ligação ao CMIN	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - PMO 2ª Fase - Reformulação do Projeto de Execução e Procedimento Concursal	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GPR	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Elaboração dos Projetos do PCC	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Avaliação de Segurança (SAO) em Fase de Projeto e Implementação - Linha Rosa + Atualização Sistema Integrado de Segurança	prevê-se atrasos face ao prazo	
ESCA CE	2º TRIMESTRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança (ISA) em Fase de Projeto e Implementação - Linha Rosa + Atualização Sistema Integrado de Segurança	prevê-se atrasos face ao prazo	
DAF	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Início da Inventariação e Etiquetação da Extensão da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR

DEX	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistema de Sinalização Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão do Fornecimento da Frota dos Novos Veículos BRT a H2 Verde	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão das Obras e Instalação de Equipamentos da HRS na Areosa	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão da Instalação dos Painéis Fotovoltaicos nas Estruturas Metálicas das Coberturas de Estacionamento na Areosa e Via Norte (Projeto MP e Obra STCP)	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão do Espaço Oficial dos Novos veículos BRT na Areosa (Projeto MP e Obra STCP)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Sistema de Detecção e Prioridade C-ITS-V2X para BRT Fases 1 e 2	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DST	1º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rubi		devia estar feito mas não está
DST	1º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistema SCADA da Linha Rubi		devia estar feito mas não está
GASQ	1º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Execução do Plano de Amostragem dos Solos nas Empreitadas	já está feito	
GPR	4º TRIMESTRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Implementação e Monitorização da Integridade e Durabilidade Estrutural em Fase de Obra da Construção da Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GPR	4º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Fornecimento de Instrumentação para Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto do Parque de Estacionamento - Campo Alegre	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT - Extensão a Matosinhos	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
ESCA CE	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Avaliação de Segurança (SAO) em Fase de Projeto e Implementação-Linha Rubi + Atualização Sistema Integrado de Segurança	já está feito	
DAF	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Início da Inventariação e Etiquetagem BRT	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

LINHA DE GONDOMAR: ESTÁDIO DO DRAGÃO - SOUTO / LINHA DA TROFA: ISMAI - MURO - PARADELA

DEX	1º TRIME STRE	Adjudicação	Aquisição de Sistema de Sinalização e Controlo MC (Linha Rubi)	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento dos Exemplos Arbóreos / Influência Radicular – Novos Projetos (Linha de Gondomar)		
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento dos Exemplos Arbóreos / Influência Radicular – Novos Projetos (Linha da Trofa)		
GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradelas (Metro + BRT)	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
ESCA CE	3º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança SAO em Fase de Projeto e Implementação - Linha Gondomar II	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
ESCA CE	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança em Fase de Projeto e Implementação - Linha Gondomar II	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
ESCA CE	3º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança SAO em Fase de Projeto e Implementação - Linha Trofa (LRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
ESCA CE	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança em Fase de Projeto e Implementação - Linha Trofa (LRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------	---------------------------

LINHA MAIA II: ROBERTO FRIAS - VERDES II / LINHA SÃO MAMEDE: HOSPITAL S. JOÃO - SRA. HORA - ESTÁDIO DO MAR

GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha S. Mamede + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo Extensão ao aeroporto) + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está

PROJETOS

GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Passagem Superior de Pedras Rubras - Projeto	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução Ampliação do Topo Sul da Trindade	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPR	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/ adiado

INFRAESTRUTURAS

DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Acabamentos das Estações e Edifícios do SMLAMP (Acordo-Quadro, lote 3)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Faixa Tátil nos Cais das Estações (Linha de Segurança) – Adaptações por Alteração da Legislação e das Normas	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e Danos na Estação de Campanhã - Intervenção	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Reparações Resultantes de Inspeções (Acordo-Quadro, Lote 2)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Reabilitação	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Via (Acordos Quadros - Lote 1)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento de Aparelhos de Via no Y da Lagoa - e Y Fonte do Cuco	devia estar feito mas não está	já está feito
DIN	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento de Aparelhos de Via (Trindade - Lapa)	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/ adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	BIM - Digitalização da Infraestrutura do SMLAMP	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para Eliminação da Passagem de Nível	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Trabalhos de Adaptação da Infraestrutura Identificados no lev 3D para Libertar Gabarits	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Edifício Sede (PCC e Edifício de Serviços)		
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão Estação Trindade - Entrada Sul	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/ adiado
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Eliminação de Passagens de Nível nas Linhas Verde e Vermelha	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/ adiado
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Trindade – Esquadra PSP	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/ adiado

SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DEX	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Assistência Técnica aos Sistemas TMS e Sinalização	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Upgrade de Controladores de Semáforos Linha A - Obsolescência	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Aquisição de Motores de AMV U50 para renovação	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/ adiado
DST	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Atualização Metro TV		devia estar feito mas não está
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Renovação Escadas Mecânicas SMLAMP		devia estar feito mas não está
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Renovação Elevadores SMLAMP		devia estar feito mas não está
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Substituição Camaras Analógicas		cancelado/ adiado
DST	2º TRIME STRE	Adjudicação	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto		devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DST	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Novo PCC- Definição do Caderno de Encargos		prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	3º TRIME STRE	Adjudicação	Renovação Quadros MT das Subestações de Tração e Postos de Transformação da Linha Amarela		prevê-se atrasos face ao prazo
DST	3º TRIME STRE	Adjudicação	Renovação Proteções DC e Intertipping das Subestações de Tração da Linha Amarela		prevê-se atrasos face ao prazo

MATERIAL CIRCULANTE LRT

DEX	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	TT-Revisão de 1.200.000 km (Conclusão)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Foles de Articulação no ET (3º Lote)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/ adiado
DEX	2º TRIME STRE	Adjudicação	Reposição de Caixas Redutoras ET	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	ET-Retrofit de 8 Conversores Auxiliares	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º TRIME STRE	Adjudicação	Contrato para Aquisição de Novo MC Linha Ruby (22+10)	já está feito	
DEX	2º TRIME STRE	Entrada em vigor	Contrato para Aquisição de Novo MC Linha Ruby (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	1º TRIME STRE	Contratação	Revisão do Projeto de Novo MC Linha Ruby (22+10)	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	3º TRIME STRE	Contratação	Fiscalização do Novo MC Linha Ruby (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/ adiado
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Novos macacos de levante para CT	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Melhoria do AVAC ET (Compressor, Ventilador e Condensador) - 6 Veículos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Avaliação de Segurança SAO 22 Veículos (+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
ESCA CE	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança de 22 Veículos (+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------	---------------------------

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1º TRIME STRE	Adjudicação	Adotar de Soluções de Segurança em Nuvem	já está feito	
GSI	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Adotar de Soluções de Segurança em Nuvem		já está feito
GSI	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)	cancelado/ adiado	
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)		cancelado/ adiado
GSI	1º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Desenvolver e Implementar de Planos de Resposta a Incidentes	já está feito	
GSI	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver e Implementar de Planos de Resposta a Incidentes		já está feito
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Elaborar e Desenvolver o Programa de Conscientização e Formação em Segurança Informática		cancelado/ adiado
GSI	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Elaborar e Desenvolver o Programa de Conscientização e Formação em Segurança Informática		
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Testar Tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), na Manutenção		cancelado/ adiado
GSI	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Testar Tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), na Manutenção		
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Usar a Gen AI para a Respostas Automáticas		devia estar feito mas não está
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Usar a Gen AI para a Respostas Automáticas		
GSI	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar de Blockchain para Segurança de Dados		
GSI	4º TRIME STRE	Adjudicação	Implementar de Blockchain para Segurança de Dados		
GSI	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar Plataformas de Colaboração Avançadas		

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GSI	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Implementar Plataformas de Colaboração Avançadas		
GSI	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)	cancelado/ adiado	
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)		
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	já está feito	
GSI	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética		já está feito
GSI	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Monitorização Contínuo e Análise de Segurança		
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Monitorização Contínuo e Análise de Segurança		
GSI	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Firewall Layer 2		
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Firewall Layer 2		
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar WAF		devia estar feito mas não está
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Implementar WAF		
GSI	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Controlo e Registo do Fluxo das Solicitações Externas numa Plataforma Web	devia estar feito mas não está	
GSI	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Marcação de Ponto mais Integrada e Flexível	cancelado/ adiado	

APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Concurso para seleção do Operador - 2026/33	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Infraestruturação Energia Praça Trindade (DST)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Transportes Alternativos (Contrato)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GAC	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
GAC	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente e Segurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Ponto de Atendimento ao Cliente	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
GAC	3º TRIME STRE	Adjudicação	Introdução de IA na Atividade de Apoio ao Cliente	prevê-se atrasos face ao prazo	
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Mapeamento em Base de Dados dos Ativos de Sinalética (BIM)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Novo Software de CRM e Reclamações	prevê-se que estará feito dentro do prazo	

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GASQ	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Publicação de Trabalhos Arqueológicos 1ª fase (Medidas PT1 e PT2 para a Exploração)		
GASQ	4º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Mapeamento dos Exemplos Arbóreos e Vedações e Muros de Delimitação Identificação do Risco ao Longo do Canal do Metro do Porto. Redes de Faixas de Gestão de Combustível		
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de Espécies Arbóreas – Estação Árvore		
GASQ	1º TRIME STRE	Adjudicação	Execução de Medida Compensatória de Impactos no Aqueduto da St.ª Clara	devia estar feito mas não está	

COMUNICAÇÃO

GCCS	4º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Edição Publicação Institucional Infometro	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GCCS	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Edição de Livro sobre o Concurso Público da Ponte D. Antónia Ferreira	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=50%
	ACUMULADO 2024	2025	até jun/25	até jun/25	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2.168.192.336	222.976	110.863	53.047	48%	24%
PROJETO INICIAL	1.506.609.295	214.226	107.113	53.047	50%	25%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1.484.486.049	0	0	0	-	-
<i>Reabjamento Campanhã</i>	17.050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	22.106.196	214.226	107.113	53.047	50%	25%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224.591.255	8.750	3.750	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE TT	116.574.106	0	0	0	-	-
OUTROS ENCARGOS	320.417.681	0	0	0	-	-
EXPANSÕES	924.745.028	352.794.331	199.534.221	75.033.155	38%	21%
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21.980.815	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70.144.087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36.639.298	0	0	0	-	-
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162.547.934	5.000	2.000	775	39%	16%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45.663.894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718.994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	202.147.997	10.600.835	1.682.518	2.558.389	152%	24%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	227.733.129	74.468.316	68.156.421	50.299.600	74%	68%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	74.335.457	196.099.561	77.785.293	16.829.578	22%	9%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	32.751.534	29.672.214	26.318.831	3.602.866	14%	12%
LINHA DE GONDOMAR II	65.021	8.113.184	4.270.684	542.096	13%	7%
LINHA DA TROFA	75.587	8.023.514	4.213.014	328.331	8%	4%
LINHA MAIA II	45.922	1.111.449	1.096.449	0	0%	0%
LINHA SÃO MAMEDE	31.253	643.764	628.764	450.599	72%	70%
MATERIAL CIRCULANTE	49.864.108	24.056.495	15.380.248	420.921	3%	2%
OUTROS ENCARGOS	55.550.770	36.850.722	18.009.562	427.965	2%	
INTERFACES	20.204.939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14.465.708	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	153.826	2.745.000	1.470.000	7.825	1%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	4.151.181	9.195.322	4.829.066	410.140	8%	4%
INFRAESTRUTURAS	10.211.886	11.825.210	5.912.605	1.246.763	21%	11%
OUTROS ENCARGOS	25.103.181	9.085.190	3.797.890	49.806	1%	1%
PCC E EDIFÍCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS	0	4.000.000	2.000.000	12.500	1%	0%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-18.739.951	0	0	-1.299.069	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	40.690.337	2.947.171	2.069.120	434.093	21%	15%
GASTOS ACE	-2.214.262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	4.954.778	1.000	1.000	-135.240	-13524%	-13524%
ATIVOS TANGÍVEIS	1.007.587	1.548.728	1.096.795	509.813	46%	33%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	2.387.614	0	0	0	-	-
INFORMÁTICA	413.812	1.397.443	971.326	58.245	6%	4%
DESPESAS GERAIS	34.140.807	0	0	1.275	-	-
TOTAL	3.189.178.472	392.815.200	219.723.766	75.948.260	35%	19%
Efeito Provisões	-16.328.961	0	0	-1.299.069	-	-
Sem Efeito Provisões	3.205.507.433	392.815.200	219.723.766	77.247.329	35%	20%

ANEXO: FINANCIAMENTO

								(valores em eur)	
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=50%		
	Contratado	Acumulado 2024	2025	até jun/25	Execução do Contratado	Execução do Orçamento			
FUNDOS NACIONAIS	760 325 268	495 625 766	98 630 602	58 333	65%	0%			
PIDDAC / OE	378 691 322	214 790 048	67 296 352	58 333	57%	0%			
PIDDAC SML e OC	117 348 358	116 548 358	800 000	58 333	99%	7%			
PIDDAC Ponte do Infante	33 759 724	33 759 724	0	0	100%	-			
PIDDAC Tram Train	8 000 000	8 000 000	0	0	100%	-			
PIDDAC DJII-SO	5 000 000	5 000 000	0	0	100%	-			
PIDDAC GONDOMAR	8 125 000	8 125 000	0	0	100%	-			
OE Linha Amarela e Rosa	103 399 416	43 356 966	24 437 528	0	42%	0%			
OE Rubi	96 000 000	0	35 000 000	0	0%	0%			
OE BRT	7 058 824	0	7 058 824	0	0%	0%			
FUNDO AMBIENTAL	381 633 946	280 835 718	31 334 250	0	74%	0%			
FA Linha Amarela e Rosa	260 700 000	227 163 600	12 631 622	0	87%	0%			
FA Material Circulante - 3ª Frota	24 644 110	22 800 000	1 844 110	0	93%	0%			
FA Material Circulante - 4ª Frota	40 242 000	0	2 682 800	0	0%	0%			
FA Mobilidade Elétrica	2 000	2 000	0	0	100%	-			
FA PEES	5 744 457	5 744 457	0	0	100%	-			
FA Rubi	40 000 000	20 000 000	10 000 000	0	50%	0%			
FA BRT	2 941 176	2 941 176	0	0	100%	-			
FA Gondomar II, Trofa, S. Mamede, Maia II	7 360 203	2 184 485	4 175 718	0	30%	0%			
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1 434 447 199	826 241 399	255 407 347	49 266 011	61%	19%			
FEDER/FSE	369 058 643	369 058 643	0	0	100%	-			
FEDER - QCA II	48 620 711	48 620 711	0	0	100%	-			
FEDER - QCA III	320 224 279	320 224 279	0	0	100%	-			
FSE - SAMA 2020	213 653	213 653	0	0	100%	-			
FUNDO DE COESÃO	700 388 556	364 994 749	81 711 393	22 208 502	55%	27%			
Dup. Póvoa e Aeroporto	67 681 903	67 681 903	0	0	100%	-			
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104 950 763	104 950 763	0	0	100%	-			
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	79 716 947	75 731 099	0	3 985 847	100%	-			
POSEUR - Casa da Música - São Bento	93 038 943	86 830 235	0	0	93%	-			
Sustentável 2030 - LR	96 000 000	29 800 747	48 000 000	18 222 654	50%	38%			
Sustentável 2030 - 4ª Frota	34 000 000	0	19 995 200	0	0%	0%			
Sustentável 2030 - GondomarII*	130 000 000	0	6 896 206	0	0%	0%			
Sustentável 2030 - Trofa*	95 000 000	0	6 819 987	0	0%	0%			
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	365 000 000	92 188 008	173 695 954	27 057 509	33%	16%			
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	299 000 000	64 745 572	151 099 561	17 974 508	28%	12%			
PRR - BRT	66 000 000	27 442 436	22 596 393	9 083 001	55%	40%			
OUTROS	689 392 175	639 512 386	164 400 840	0	93%	0%			
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0	0%	-			
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	241 933	241 933	0	0	100%	-			
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0	0%	-			
Património/capital	639 270 452	639 270 452	164 400 840	0	100%	0%			
TOTAL	2 884 164 642	1 961 379 551	518 438 789	49 324 344	70%	10%			

* Sustentável 2030 - Candidatura ainda não formalizada, valor previsto nos Avisos

								(valores em euros)	
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=50%		
	Contratado	Acumulado 2024	2025	até jun/25	Execução do Contratado	Execução do Orçamento			
DGTF	90.000.000	0	0	0	0%	-			
BEI	36.521.729	36.521.729	-2.608.697	0	100%	0%			
BANCA COMERCIAL	83.641.303	87.500.000	-87.500.000	-3.858.697	100%	4%			
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	210.163.032	124.021.728	-90.108.697	-3.858.697	57%	4%			

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]	
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=50%	
	2025	até jun/25	Execução do Orçamento	
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	2.100.000	0	0%	
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.103.368	11.722.705	69%	
TOTAL	19.203.368	11.722.705	-	

ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[4]/[1]	[4]/[3]
	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL	REAL	REAL	Duodécimo=50%	Duodécimo=50%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até jun/25	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	638.314.423	463.323.605	573.155.717	206.309.159	0	32%	36%
Impostos Directos	0	0	0	0	0	-	-
Impostos Indirectos	0	0	0	0	0	-	-
Contrib. Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0	0	-	-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	396.000	396.000	396.000	773.763	0	195%	195%
Rendimentos da Propriedade	0	0	0	12.612	0	-	-
Transferências Correntes	4.202.988	4.200.928	4.200.928	9.336.122	0	222%	222%
Estado (TSA - GPIAAAF)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0%	0%
Administração Local (PART)	2.102.988	2.100.928	2.100.928	9.336.122	0	444%	444%
Outras Transferências	0	0	0	0	0	-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	82.989.192	82.913.095	82.913.095	28.765.223	0	35%	35%
Aluguer de espaços e equipamentos	948.123	948.016	948.016	442.410	0	47%	47%
TSA	15.000.380	14.983.631	14.983.631	2.386.583	0	16%	16%
Outras (inclui Receita Tarifária)	67.040.689	66.981.448	66.981.448	25.936.231	0	39%	39%
Outras Receitas Correntes (inclui reembolsos IVA)	32.272.453	32.272.117	32.272.117	7.062.672	0	22%	22%
Venda Bens de Investimento	15.000	15.000	15.000	911.842	0	6079%	6079%
Transferências de Capital	354.037.950	301.572.947	315.156.697	62.908.094	0	18%	20%
Estado (PIDDAC e OE)	67.296.352	800.000	800.000	58.333	0	0%	7%
Sustentável 2030	81.711.393	81.711.393	81.711.393	18.222.654	0	22%	22%
PRR	173.695.954	173.695.954	187.279.704	40.641.259	0	23%	22%
Fundo Ambiental	31.334.250	45.365.600	45.365.600	0	0	0%	0%
Outras Transferências (incl. POSEUR)	0	0	0	3.985.847	0	-	-
Outras Receitas de Capital	164.400.840	0	0	0	0	0%	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	290.470	0	-	-
Activos Financeiros	0	0	84.716.251	84.716.250	0	-	100%
Passivos Financeiros	0	41.953.518	41.953.518	0	0	-	0%
Empréstimos (DGTF)	0	0	0	0	0	-	-
Realizações de Capital (DGTF)	0	41.953.518	41.953.518	0	0	-	0%
Saldo Gerência Anterior	0	0	11.532.111	11.532.110	0	-	100%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-
DESPESA	638.314.423	463.323.605	469.496.223	113.096.244	238.443.495	18%	24%
Despesas com Pessoal	6.850.583	6.850.582	6.258.389	3.020.646	2.737.062	44%	48%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	78.272.620	78.267.895	82.316.861	33.291.558	12.050.623	43%	40%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	78.066.235	62.181.266	62.181.266	28.301.616	3.855.382	36%	46%
Outras	206.385	16.086.629	20.135.595	4.989.942	8.195.242	2418%	25%
Juros e Outros Encargos	4.374.176	4.374.178	4.758.562	2.106.857	2.322.282	48%	44%
Banca Comercial	2.982.194	2.982.195	2.982.195	886.187	2.096.008	30%	30%
DGTF	222.092	222.093	194.331	0	194.331	0%	0%
BEI	1.054.748	1.054.748	1.054.748	1.054.748	0	100%	100%
Outras	115.142	115.142	527.288	165.922	31.943	144%	31%
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	-	-
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	10.452.935	10.452.275	10.702.727	644.534	10.023.557	6%	6%
Aquis. Bens de Investimento	413.254.412	360.768.978	362.850.112	70.173.952	212.559.095	17%	19%
Santo Ovídio - Vila d'Este (Amarela)	12.212.787	12.212.787	6.157.900	2.651.358	626.373	22%	43%
Casa da Música - São Bento (Rosa)	76.395.177	51.957.648	56.913.418	40.091.737	-1.689.140	52%	70%
Casa da Música - Santo Ovídio (Rubi)	198.668.390	163.668.390	168.016.910	19.835.020	128.056.848	10%	12%
BRT Boavista - Império - Pç. Cid. Salv.	32.902.495	25.824.007	25.318.370	3.427.849	8.199.080	10%	14%
Gondomar II	8.262.998	8.262.998	7.932.149	666.778	7.271.270	8%	8%
Trofa	8.155.876	8.155.876	7.905.876	403.847	6.679.720	5%	5%
S. Mamede	786.009	786.009	811.009	554.237	53.550	71%	68%
Maia II	1.376.848	1.376.848	1.150.717	0	821.585	0%	0%
3ª Frota	1.780.701	1.780.701	1.780.701	244.411	763.715	14%	14%
4ª Frota	26.336.658	40.368.008	40.314.008	18.696	27.447.061	0%	0%
Outros	46.376.475	46.375.706	46.549.054	2.280.020	34.329.032	5%	5%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	513.204.726	460.713.908	466.886.651	109.237.547	239.692.620	21%	23%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	1.000	1.000	875	0	875	0%	0%
Banca Comercial	125.108.697	2.608.697	2.608.697	3.858.697	-1.250.000	3%	148%
DGTF	87.500.000	0	0	0	-1.250.000	0%	-
BEI	0	0	0	0	0	-	-
Outras	2.608.697	2.608.697	2.608.697	2.608.697	0	100%	100%
Extraorçamentais	35.000.000	0	0	0	0	0%	-
