

Relatório de Execução Trimestral – 1ºT.2025

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2025	mar-2025	mar-2024	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4.475.758	3.403.985	3.251.861	152.124
Propriedades de investimento		538.521	0	538.521
Ativos intangíveis	2.410.033.295	2.072.899.050	1.918.646.636	154.252.413
Participações financeiras	2.439.317	2.670.977	2.478.317	192.660
Subtotal	2.416.948.369	2.079.512.533	1.924.376.814	155.135.719
Ativo corrente				
Clientes, contribuintes e utentes	5.704.129	1.511.454	1.335.974	175.480
Estado e outros entes públicos	8.812.061	7.907.901	4.214.368	3.693.533
Acionistas		0	0	0
Outras contas a receber	44.440.971	10.543.870	3.160.678	7.383.192
Diferimentos	42.196	27.058	42.196	-15.138
Outros ativos financeiros	31.755.718	0	23.614.032	-23.614.032
Ativos não correntes detidos para venda	315.475	0	316.126	-316.126
Caixa e Depósitos	13.210.270	139.046.398	128.919.342	10.127.056
Subtotal	104.280.820	159.036.681	161.602.717	-2.566.036
Total do ativo	2.521.229.190	2.238.549.214	2.085.979.531	152.569.683
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	711.576.980	639.270.452	497.006.899	142.263.553
Outros instrumentos de capital próprio	241.933	241.933	241.933	0
Resultados transitados	-90.852.096	-67.296.060	-50.328.288	-16.967.772
Ajustamentos em ativos financeiros	3.480.721	-330.290	569.751	-900.041
Subsídios ao investimento	1.382.663.479	1.002.767.159	853.756.112	149.011.046
Outras variações no património líquido	36.934.066	0	13.327.855	-13.327.855
Resultado líquido do período	-43.772.435	-9.569.361	-13.239.252	3.669.891
Total do património líquido	2.000.272.648	1.565.083.833	1.301.335.011	263.748.822
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	452.980.942	497.741.845	498.837.024	-1.095.179
Financiamentos obtidos	39.740.339	118.913.032	124.021.728	-5.108.697
Outras contas a pagar	0	386.330	369.677	16.653
Subtotal	492.721.281	617.041.207	623.228.429	-6.187.223
Passivo corrente				
Fornecedores	6.569.419	33.212.812	29.186.879	4.025.934
Fornecedores de investimentos	11.592.322	9.875.157	8.541.420	1.333.737
Estado e outros entes públicos	0	174.468	339.158	-164.690
Financiamentos obtidos	4.295.474	4.434.922	116.172.479	-111.737.558
Outras contas a pagar	5.496.656	5.585.262	6.894.764	-1.309.502
Diferimentos	0	3.141.555	0	3.141.555
Outros passivos financeiros	281.391	0	281.391	-281.391
Subtotal	28.235.261	56.424.175	161.416.090	-104.991.916
Total do passivo	520.956.542	673.465.381	784.644.520	-111.179.138
Total do património líquido e passivo	2.521.229.190	2.238.549.214	2.085.979.531	152.569.683


Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a mar 2025	jan a mar-2025	jan a mar-2024	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	110.649.249	41.705.143	23.306.901	18.398.242
Serviços prestados (transporte)	18.483.167	17.049.941	12.362.120	4.687.821
Outras vendas e serviços prestados	760.885	357.678	504.528	-146.849
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	495.988	493.894	285.683	208.211
Trabalhos para a própria entidade		0	0	0
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-110.649.249	-41.705.143	-23.306.901	-18.398.242
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-12.853.643	-10.808.165	-10.197.156	-611.009
Outros fornecimentos e serviços externos	-3.608.447	-2.242.928	-1.621.083	-621.845
Gastos com o pessoal	-1.450.851	-1.580.324	-1.420.085	-160.239
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0
Provisões líquidas	0	0	0	0
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	0	38.242	0	38.242
Outros rendimentos e ganhos	8.916.177	4.616.208	4.361.330	254.877
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-5.000	0	0	0
Outros gastos e perdas	-182.951	-1.533.902	-137.207	-1.396.695
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	10.555.324	6.390.645	4.138.130	2.252.514
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-19.519.483	-14.952.675	-14.898.360	-54.315
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-8.964.159	-8.562.030	-10.760.230	2.198.199
Juros e rendimentos similares obtidos	0	12.620	24.030	-11.410
Juros e gastos similares suportados	-656.552	-1.019.951	-2.503.052	1.483.101
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	-9.620.711	-9.569.361	-13.239.252	3.669.891
Imposto sobre o rendimento	-754.240	0	0	0
Resultado líquido do período	-10.374.951	-9.569.361	-13.239.252	3.669.891

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2025	jan a mar-2025	jan a mar-2024	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	84.913.087	22.583.733	24.157.549	-1.573.816
Pagamentos a fornecedores	-77.842.688	-14.986.051	-18.067.113	3.081.062
Pagamentos ao pessoal	-6.558.749	-1.385.053	-1.282.296	-102.757
Caixa gerada pelas operações	511.650	6.212.629	4.808.140	1.404.489
Outros recebimentos/pagamentos	27.243.592	238.072	40.232	197.839
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3.452.746	2.092.547	2.150.752	-58.205
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	24.302.496	8.543.248	6.999.124	1.544.124
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-1.771.607	-19.469	-28.434	8.966
Ativos intangíveis	-411.482.805	-17.386.217	-15.658.122	-1.728.094
Investimentos financeiros	-35.001.000	0	-30.784.424	30.784.424
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros	0	98.300.000	143.419.723	-45.119.723
Subsídios ao investimento	354.037.950	38.817.664	13.240.832	25.576.833
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-94.217.463	119.711.979	112.024.871	7.687.108
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	164.400.840	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-90.108.697	-1.250.000	-1.250.000	0
Juros e gastos similares	-4.377.176	-776.563	-2.066.040	1.289.477
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	69.914.966	-2.026.563	-3.316.040	1.289.477
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	0	126.228.664	115.707.955	10.520.709
Efeitos das diferenças de câmbio		0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.210.270	12.817.734	13.210.270	-392.536
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13.210.270	139.046.398	128.919.342	10.127.056

Prazo Médio de Pagamentos

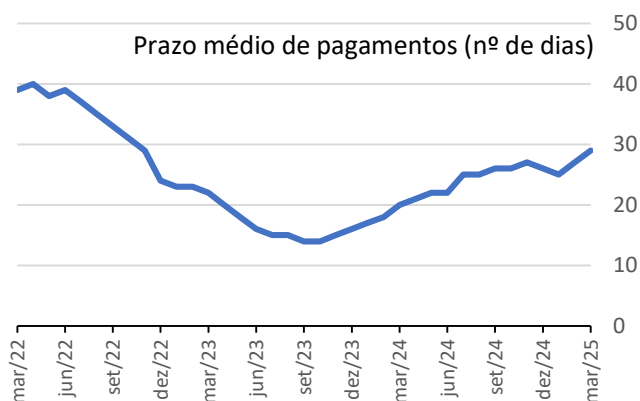

- Em fevereiro de 2025, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 29 dias, valor que compara com 27 dias no mês anterior e com 20 dias em março de 2024.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 1º trimestre de 2025, cifrou-se em 23 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de fevereiro, uma execução de 23% face ao previsto no PAO 2025 e de 25% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
 - Para a execução orçamental da receita em 2025, até final de fevereiro, contribuíram sobretudo os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 84,7 M€), o PRR (37,0 M€, incluindo o saldo transitado do ano anterior), o saldo da gerência anterior (11,5 M€) e a receita tarifária (9,8 M€).
 - Do lado da Despesa, a execução orçamental em 2025, até final de fevereiro, representou cerca de 2% face ao PAO 2025, e 3% em relação ao Orçamento do Estado.
 - Em janeiro foi registada a cativação orçamental no valor global de 30,6 M€.
 - Foi realizado crédito especial pelo saldo transitado do PRR no valor de 13,6 M€ e registado em receita o saldo transitado proveniente de outras fontes de financiamento.
 - Em março foram realizados dois pedidos de alteração orçamental. Um relativo ao reforço de participação no Centro de Competências Ferroviário, que não obteve aprovação e outro relativo à aplicação do saldo transitado, no valor de 96,2 M€, que ainda aguarda aprovação.
 - Em março foi também aprovado o pedido de descativação, cujo pedido tinha sido realizado a 7 de março, no montante total de 26,7M€.
-

CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES

➤ A condicionalidade inerente à aprovação do Plano de Atividades da empresa para 2025 através do Despacho n.º 176/2025-SETF apresentava, em 31 de março de 2025, a seguinte execução:

Condições de aprovação do PAO 2025	Limite aprovado	Execução até 31/março
Gastos operacionais (milhares de euros)	68 989	13 252
Contratação de trabalhadores	7	0
Substituição de viaturas automóveis operacionais, em regime de AOV	1	0
Renovação da frota automóvel não operacional	27	0
Aquisição de viaturas automóveis operacionais	2	0

➤ No final do 1º trimestre de 2025, as 27 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2025 cujo horizonte de realização estava previsto para o 1º trimestre apresentavam a seguinte distribuição:

- 6 atividades já concluídas;
- 12 atividades com atraso face ao previsto;
- 3 atividades canceladas ou adiadas;
- 6 atividades em relação às quais não foi possível obter informação.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

LINHA ROSA / LINHA AMARELA

GPC	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento da Operação - Linha Rosa - Sustentável 2030	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º TRIME STRE	Adjudicação	Sistema de Sinalização no Parque Vila d' Este (Fase 2)	já está feito
DEX	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Definição e Concursos Equipamentos. Vila d'Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	2º TRIME STRE	Adjudicação	Parque Fotovoltaico de Vila d'Este	
GASQ	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE-MM24_ Estação Liberdade/S. Bento e Estação Boavista/Casa da Música - Linha Rosa - Relatório	
GASQ	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM34_ Estação Liberdade/S. Bento: Escavação Integral - Linha Rosa_Lóios - Aprovação do Relatório Final pela Tutela	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM25_Rio da Vila/RECAPE_S. Domingos Relatório	devia estar feito mas não está
GASQ	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_Hospital Santo António e Miguel Bombarda – Sondagens - Relatório	já está feito
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_Estação Galiza- sondagens Arqueológicas - Linha Rosa - Relatório	já está feito
GASQ	1º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-PM5_ Intervenção Preventiva no Edifício Linha Rosa	devia estar feito mas não está
GASQ	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3033-MM27_Escavação Arqueológica Quinta do Cisne	
GASQ	1º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM27_Escavação Arqueológica Quinta do Cisne Análises Paleoambientais Processamento / Análise de Ecofactos	devia estar feito mas não está
GASQ	2º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM101_Publicação dos Trabalhos de Minimização Patrimonial	
GASQ	1º TRIMESTRE	Adjudicação	DCAPE3033-MM106_Mitigação Associada a Compensação Sobreiros	já está feito
GASQ	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	DCAPE3032_EL14_Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa	
GASQ	2º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	DCAPE3032_EL14_Memória da Fonte da Natividade, Muralha Fernandina e Ponte S. Domingos - Linha Rosa	
GASQ	4º TRIMESTRE	Adjudicação	Implementação das Medidas de Autoproteção - Linha Rosa	
GASQ	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Pós Avaliação Ambiental - Fase de Construção e Exploração - Linha Rosa	
GCPE	2º TRIMESTRE	marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Início dos Testes Integrados Extensão da Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo
GCPE	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Início da Operação Comercial da Extensão da Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Ligação ao CMIN	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GPR	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - PMO 2ª Fase - Reformulação do Projeto de Execução e Procedimento Concursal	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Elaboração dos Projetos do PCC	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Avaliação de Segurança (SAO) em Fase de Projeto e Implementação - Linha Rosa + Atualização Sistema Integrado de Segurança	prevê-se atrasos face ao prazo
ESCA CE	2º TRIMESTRE	marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança (ISA) em Fase de Projeto e Implementação - Linha Rosa + Atualização Sistema Integrado de Segurança	prevê-se atrasos face ao prazo
DAF	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Início da Inventariação e Etiquetação da Extensão da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo

LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR

DEX	2º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistema de Sinalização Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão do Fornecimento da Frota dos Novos Veículos BRT a H2 Verde	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão das Obras e Instalação de Equipamentos da HRS na Areosa	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão da Instalação dos Painéis Fotovoltaicos nas Estruturas Metálicas das Coberturas de Estacionamento na Areosa e Via Norte (Projeto MP e Obra STCP)	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão do Espaço Oficial dos Novos veículos BRT na Areosa (Projeto MP e Obra STCP)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Sistema de Detecção e Prioridade C-ITS-V2X para BRT Fases 1 e 2	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	1º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rubi	
DST	1º TRIMESTRE	Adjudicação	Sistema SCADA da Linha Rubi	
GASQ	1º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Execução do Plano de Amostragem dos Solos nas Empreitadas	já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GPR	4º TRIME STRE	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Implementação e Monitorização da Integridade e Durabilidade Estrutural em Fase de Obra da Construção da Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	4º TRIME STRE	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Fornecimento de Instrumentação para Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto do Parque de Estacionamento - Campo Alegre	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT - Extensão a Matosinhos	prevê-se atrasos face ao prazo
ESCA CE	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Avaliação de Segurança (SAO) em Fase de Projeto e Implementação-Linha Rubi + Atualização Sistema Integrado de Segurança	já está feito
DAF	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Início da Inventariação e Etiquetagem BRT	prevê-se atrasos face ao prazo

LINHA DE GONDOMAR: ESTÁDIO DO DRAGÃO - SOUTO / LINHA DA TROFA: ISMAI - MURO - PARADELA

DEX	1º TRIME STRE	Adjudicação	Aquisição de Sistema de Sinalização e Controlo MC (Linha Rubi)	devia estar feito mas não está
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento dos Exemplos Arbóreos / Influência Radicular – Novos Projetos (Linha de Gondomar)	
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento dos Exemplos Arbóreos / Influência Radicular – Novos Projetos (Linha da Trofa)	
GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA	devia estar feito mas não está
GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradela (Metro + BRT)	devia estar feito mas não está
ESCA CE	3º TRIME STRE	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança SAO em Fase de Projeto e Implementação - Linha Gondomar II	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança em Fase de Projeto e Implementação - Linha Gondomar II	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	3º TRIME STRE	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Avaliação de Segurança SAO em Fase de Projeto e Implementação - Linha Trofa (LRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
ESCA CE	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança em Fase de Projeto e Implementação - Linha Trofa (LRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
LINHA MAIA II: ROBERTO FRIAS - VERDES II / LINHA SÃO MAMEDE: HOSPITAL S. JOÃO - SRA. HORA - ESTÁDIO DO MAR				
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha S. Mamede + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo Extensão ao aeroporto) + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo
PROJETOS				
GPR	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Passagem Superior de Pedras Rubras - Projeto	devia estar feito mas não está
GPR	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução Ampliação do Topo Sul da Trindade	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA	prevê-se que estará feito dentro do prazo
INFRAESTRUTURAS				
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Acabamentos das Estações e Edifícios do SMLAMP (Acordo-Quadro, lote 3)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Faixa Táctil nos Cais das Estações (Linha de Segurança) – Adaptações por Alteração da Legislação e das Normas	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e Danos na Estação de Campanhã - Intervenção	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Reparações Resultantes de Inspeções (Acordo-Quadro, Lote 2)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Reabilitação	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Via (Acordos Quadros - Lote 1)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DIN	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento de Aparelhos de Via no Y da Lagoa - e Y Fonte do Cuco	devia estar feito mas não está
DIN	2º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento de Aparelhos de Via (Trindade - Lapa)	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	BIM - Digitalização da Infraestrutura do SMLAMP	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para Eliminação da Passagem de Nível	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Trabalhos de Adaptação da Infraestrutura Identificados no lev 3D para Libertar Gabarits	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Edifício Sede (PCC e Edifício de Serviços)	
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão Estação Trindade - Entrada Sul	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Eliminação de Passagens de Nível nas Linhas Verde e Vermelha	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Trindade – Esquadra PSP	prevê-se atrasos face ao prazo

SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DEX	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Assistência Técnica aos Sistemas TMS e Sinalização	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Upgrade de Controladores de Semáforos Linha A - Obsolescência	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Aquisição de Motores de AMV U50 para renovação	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Atualização Metro TV	
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Renovação Escadas Mecânicas SMLAMP	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Renovação Elevadores SMLAMP	
DST	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Substituição Camaras Analógicas	
DST	2º TRIME STRE	Adjudicação	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto	
DST	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Novo PCC- Definição do Caderno de Encargos	
DST	3º TRIME STRE	Adjudicação	Renovação Quadros MT das Subestações de Tração e Postos de Transformação da Linha Amarela	
DST	3º TRIME STRE	Adjudicação	Renovação Proteções DC e Intertripping das Subestações de Tração da Linha Amarela	

MATERIAL CIRCULANTE LRT

DEX	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	TT-Revisão de 1.200.000 km (Conclusão)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Foles de Articulação no ET (3º Lote)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIME STRE	Adjudicação	Reposição de Caixas Redutoras ET	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	ET-Retrofit de 8 Conversores Auxiliares	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º TRIME STRE	Adjudicação	Contrato para Aquisição de Novo MC Linha Ruby (22+10)	já está feito
DEX	2º TRIME STRE	Entrada em vigor	Contrato para Aquisição de Novo MC Linha Ruby (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º TRIME STRE	Contratação	Revisão do Projeto de Novo MC Linha Ruby (22+10)	devia estar feito mas não está
DEX	3º TRIME STRE	Contratação	Fiscalização do Novo MC Linha Ruby (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Novos macacos de levante para CT	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Melhoria do AVAC ET (Compressor, Ventilador e Condensador) - 6 Veículos	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Avaliação de Segurança SAO 22 Veículos (+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
ESCA CE	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	ISA da Avaliação de Segurança de 22 Veículos (+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1º TRIMESTRE	Adjudicação	Adotar de Soluções de Segurança em Nuvem	já está feito
GSI	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Adotar de Soluções de Segurança em Nuvem	
GSI	1º TRIMESTRE	Lançamento do Procedimento	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)	cancelado/adiado
GSI	4º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)	
GSI	1º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Desenvolver e Implementar de Planos de Resposta a Incidentes	já está feito
GSI	3º TRIMESTRE	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver e Implementar de Planos de Resposta a Incidentes	
GSI	2º TRIMESTRE	Lançamento do Procedimento	Elaborar e Desenvolver o Programa de Conscientização e Formação em Segurança Informática	
GSI	3º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Elaborar e Desenvolver o Programa de Conscientização e Formação em Segurança Informática	
GSI	2º TRIMESTRE	Lançamento do Procedimento	Testar Tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), na Manutenção	
GSI	4º TRIMESTRE	Início dos Trabalhos	Testar Tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), na Manutenção	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Usar a Gen AI para a Respostas Automáticas	
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Usar a Gen AI para a Respostas Automáticas	
GSI	4º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar de Blockchain para Segurança de Dados	
GSI	4º TRIME STRE	Adjudicação	Implementar de Blockchain para Segurança de Dados	
GSI	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar Plataformas de Colaboração Avançadas	
GSI	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Implementar Plataformas de Colaboração Avançadas	
GSI	1º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)	cancelado/ adiado
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)	
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	
GSI	3º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	
GSI	3º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Monitorização Contínuo e Análise de Segurança	
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Monitorização Contínuo e Análise de Segurança	
GSI	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Firewall Layer 2	
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Firewall Layer 2	
GSI	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Implementar WAF	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GSI	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Implementar WAF	
GSI	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Controlo e Registo do Fluxo das Solicitações Externas numa Plataforma Web	devia estar feito mas não está
GSI	1º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Marcação de Ponto mais Integrada e Flexível	cancelado/ adiado

APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Concurso para seleção do Operador - 2026/33	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Infraestruturação Energia Praça Trindade (DST)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º TRIME STRE	Lançamento do Procedimento	Transportes Alternativos (Contrato)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	4º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente e Segurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Ponto de Atendimento ao Cliente	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	3º TRIME STRE	Adjudicação	Introdução de IA na Atividade de Apoio ao Cliente	prevê-se atrasos face ao prazo
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Mapeamento em Base de Dados dos Ativos de Sinalética (BIM)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	2º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Novo Software de CRM e Reclamações	prevê-se que estará feito dentro do prazo

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GASQ	3º TRIME STRE	Início dos Trabalhos	Publicação de Trabalhos Arqueológicos 1ª fase (Medidas PT1 e PT2 para a Exploração)	
------	---------------	----------------------	---	--

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GASQ	4º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Mapeamento dos Exemplos Arbóreos e Vedações e Muros de Delimitação Identificação do Risco ao Longo do Canal do Metro do Porto. Redes de Faixas de Gestão de Combustível	
GASQ	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de Espécies Arbóreas – Estação Árvore	
GASQ	1º TRIME STRE	Adjudicação	Execução de Medida Compensatória de Impactos no Aqueduto da St.ª Clara	devia estar feito mas não está
COMUNICAÇÃO				
GCCS	4º TRIME STRE	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Edição Publicação Institucional Infometro	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GCCS	4º TRIME STRE	Conclusão dos Trabalhos	Edição de Livro sobre o Concurso Público da Ponte D. Antónia Ferreira	prevê-se atrasos face ao prazo

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=25%
	ACUMULADO 2024	2025	até mar/25	até mar/25	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2.168.192.336	222.976	55.557	53.047	95%	24%
PROJETO INICIAL	1.506.609.295	214.226	53.557	53.047	99%	25%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1.484.486.049	0	0	0	-	-
<i>Reabjamento Campanhã</i>	17.050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	22.106.196	214.226	53.557	53.047	99%	25%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224.591.255	8.750	2.000	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE TT	116.574.106	0	0	0	-	-
OUTROS ENCARGOS	320.417.681	0	0	0	-	-
EXPANSÕES	925.035.028	352.794.331	102.268.697	40.488.487	40%	11%
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21.980.815	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70.144.087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36.639.298	0	0	0	-	-
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162.547.934	5.000	1.000	775	78%	16%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45.663.894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718.994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	202.147.997	10.600.835	295.660	1.235.672	418%	12%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	227.733.129	74.468.316	45.848.107	11.610.007	25%	16%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	74.335.457	196.099.561	31.771.599	24.863.838	78%	13%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	32.751.534	29.672.214	15.573.009	2.109.796	14%	7%
LINHA DE GONDOMAR II	65.021	8.113.184	2.390.684	375.545	16%	5%
LINHA DA TROFA	75.587	8.023.514	2.333.014	62.875	3%	1%
LINHA MAIA II	45.922	1.111.449	15.000	0	0%	0%
LINHA SÃO MAMEDE	31.253	643.764	15.000	78.640	524%	12%
MATERIAL CIRCULANTE	50.154.108	24.056.495	4.025.624	151.338	4%	1%
OUTROS ENCARGOS	55.260.770	36.850.722	8.324.996	1.176.109	14%	
INTERFACES	20.204.939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14.465.708	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	153.826	2.745.000	840.000	5.335	1%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3.861.181	9.195.322	2.037.771	318.780	16%	3%
INFRAESTRUTURAS	10.211.886	11.825.210	2.943.803	805.067	27%	7%
OUTROS ENCARGOS	25.103.181	9.085.190	1.503.422	34.427	2%	0%
PCC E EDIFÍCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS	0	4.000.000	1.000.000	12.500	1%	0%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-18.739.951	0	0	0	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	40.690.337	2.947.171	1.170.230	395.050	34%	13%
GASTOS ACE	-2.214.262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	4.954.778	1.000	1.000	-135.240	-13524%	-13524%
ATIVOS TANGÍVEIS	1.007.587	1.548.728	892.089	486.652	55%	31%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	2.387.614	0	0	0	-	-
INFORMÁTICA	413.812	1.397.443	277.141	43.638	16%	3%
DESPESAS GERAIS	34.140.807	0	0	0	-	-
TOTAL	3.189.178.472	392.815.200	111.819.479	42.112.693	38%	11%
Efeito Provisões	-16.328.961	0	0	0	-	-
Sem Efeito Provisões	3.205.507.433	392.815.200	111.819.479	42.112.693	38%	11%

ANEXO: FINANCIAMENTO

							(valores em eur)	
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	[(4)+[2)]/[1]	[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=25%		
	Contratado	Acumulado 2024	2025	até mar / 25	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
FUNDOS NACIONAIS	760.325.268	495.625.766	98.630.602	58.333	65%	0%		
PIDDAC / OE	378.691.322	214.790.048	67.296.352	58.333	57%	0%		
PIDDAC SML e OC	117.348.358	116.548.358	800.000	58.333	99%	7%		
PIDDAC Ponte do Infante	33.759.724	33.759.724	0	0	100%	-		
PIDDAC Tram Train	8.000.000	8.000.000	0	0	100%	-		
PIDDAC DJII-SO	5.000.000	5.000.000	0	0	100%	-		
PIDDAC GONDOMAR	8.125.000	8.125.000	0	0	100%	-		
OE Linha Amarela e Rosa	103.399.416	43.356.966	24.437.528	0	42%	0%		
OE Rubi	96.000.000	0	35.000.000	0	0%	0%		
OE BRT	7.058.824	0	7.058.824	0	0%	0%		
FUNDO AMBIENTAL	381.633.946	280.835.718	31.334.250	0	74%	0%		
FA Linha Amarela e Rosa	260.700.000	227.163.600	12.631.622	0	87%	0%		
FA Material Circulante - 3ª Frota	24.644.110	22.800.000	1.844.110	0	93%	0%		
FA Material Circulante - 4ª Frota	40.242.000	0	2.682.800	0	0%	0%		
FA Mobilidade Elétrica	2.000	2.000	0	0	100%	-		
FA PEES	5.744.457	5.744.457	0	0	100%	-		
FA Rubi	40.000.000	20.000.000	10.000.000	0	50%	0%		
FA BRT	2.941.176	2.941.176	0	0	100%	-		
FA Gondomar II, Trofa, S. Mamede, Maia II	7.360.203	2.184.485	4.175.718	0	30%	0%		
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1.434.447.199	826.241.399	255.407.347	38.759.331	60%	15%		
FEDER/FSE	369.058.643	369.058.643	0	0	100%	-		
FEDER - QCA II	48.620.711	48.620.711	0	0	100%	-		
FEDER - QCA III	320.224.279	320.224.279	0	0	100%	-		
FSE - SAMA 2020	213.653	213.653	0	0	100%	-		
FUNDO DE COESÃO	700.388.556	364.994.749	81.711.393	15.382.234	54%	19%		
Dup. Póvoa e Aeroporto	67.681.903	67.681.903	0	0	100%	-		
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104.950.763	104.950.763	0	0	100%	-		
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	79.716.947	75.731.099	0	3.985.847	100%	-		
POSEUR - Casa da Música - São Bento	93.038.943	86.830.235	0	0	93%	-		
Sustentável 2030 - LR	96.000.000	29.800.747	48.000.000	11.396.387	43%	24%		
Sustentável 2030 - 4ª Frota*	34.000.000	0	19.995.200	0	0%	0%		
Sustentável 2030 - GondomarII*	130.000.000	0	6.896.206	0	0%	0%		
Sustentável 2030 - Trofa*	95.000.000	0	6.819.987	0	0%	0%		
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	365.000.000	92.188.008	173.695.954	23.377.097	32%	13%		
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	299.000.000	64.745.572	151.099.561	17.974.508	28%	12%		
PRR - BRT	66.000.000	27.442.436	22.596.393	5.402.589	50%	24%		
OUTROS	689.392.175	639.512.386	164.400.840	0	93%	0%		
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49.879.790	0	0	0	0%	-		
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	241.933	241.933	0	0	100%	-		
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0	0%	-		
Património/capital	639.270.452	639.270.452	164.400.840	0	100%	0%		
TOTAL	2.884.164.642	1.961.379.551	518.438.789	38.817.664	69%	7%		

* Sustentável 2030 - Candidatura ainda não formalizada, valor previsto nos Avisos

							(valores em euros)	
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	[(4)+[2)]/[1]	[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=25%		
	Contratado	Acumulado 2024	2025	até mar / 25	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
DGTF	90.000.000	0	0	0	0%	-		
BEI	36.521.729	36.521.729	-2.608.697	0	100%	0%		
BANCA COMERCIAL	86.250.000	87.500.000	-87.500.000	-1.250.000	100%	1%		
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	212.771.728	124.021.728	-90.108.697	-1.250.000	58%	1%		

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]		
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=25%		
	2025	até mar / 25	Execução do Orçamento		
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	2.100.000	0	0%		
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.103.368	7.845.635	46%		
TOTAL	19.203.368	7.845.635	-		

ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[4]/[1]	[4]/[3]
	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL	REAL	REAL	Duodécimo=25%	Duodécimo=25%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até mar/25	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	638.314.423	463.323.605	573.155.717	173.736.772	0	27%	30%
Impostos Directos	0	0	0	0	0	-	-
Impostos Indirectos	0	0	0	0	0	-	-
Contrib. Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0	0	-	-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	396.000	396.000	396.000	450.928	0	114%	114%
Rendimentos da Propriedade	0	0	0	12.612	0	-	-
Transferências Correntes	4.202.988	4.200.928	4.200.928	5.459.052	0	130%	130%
Estado (TSA - GPIAAAF)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0%	0%
Administração Local (PART)	2.102.988	2.100.928	2.100.928	5.459.052	0	260%	260%
Outras Transferências	0	0	0	0	0	-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	82.989.192	82.913.095	82.913.095	16.664.799	0	20%	20%
Aluguer de espaços e equipamentos	948.123	948.016	948.016	275.582	0	29%	29%
TSA	15.000.380	14.983.631	14.983.631	2.386.583	0	16%	16%
Outras (inclui Receita Tarifária)	67.040.689	66.981.448	66.981.448	14.002.634	0	21%	21%
Outras Receitas Correntes (inclui reembolsos IVA)	32.272.453	32.272.117	32.272.117	2.182.585	0	7%	7%
Venda Bens de Investimento	15.000	15.000	15.000	26.550	0	177%	177%
Transferências de Capital	354.037.950	301.572.947	315.156.697	52.401.414	0	15%	17%
Estado (PIDDAC e OE)	67.296.352	800.000	800.000	58.333	0	0%	7%
Sustentável 2030	81.711.393	81.711.393	81.711.393	11.396.387	0	14%	14%
PRR	173.695.954	173.695.954	187.279.704	36.960.847	0	21%	20%
Fundo Ambiental	31.334.250	45.365.600	45.365.600	0	0	0%	0%
Outras Transferências (incl. POSEUR)	0	0	0	3.985.847	0	-	-
Outras Receitas de Capital	164.400.840	0	0	0	0	0%	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	290.470	0	-	-
Activos Financeiros	0	0	84.716.251	84.716.250	0	-	100%
Passivos Financeiros	0	41.953.518	41.953.518	0	0	-	0%
Empréstimos (DGTF)	0	0	0	0	0	-	-
Realizações de Capital (DGTF)	0	41.953.518	41.953.518	0	0	-	0%
Saldo Gerência Anterior	0	0	11.532.111	11.532.110	0	-	100%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-
DESPESA	638.314.423	463.323.605	472.613.256	35.989.695	284.501.267	6%	8%
Despesas com Pessoal	6.850.583	6.850.582	6.880.582	1.393.724	5.114.020	20%	20%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	78.272.620	78.267.895	82.153.495	11.929.935	34.984.976	15%	15%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	78.066.235	62.181.266	62.181.266	9.786.798	24.289.882	13%	16%
Outras	206.385	16.086.629	19.972.229	2.143.136	10.695.094	1038%	11%
Juros e Outros Encargos	4.374.176	4.374.178	4.517.456	263.923	4.111.466	6%	6%
Banca Comercial	2.982.194	2.982.195	2.982.195	254.021	2.728.174	9%	9%
DGTF	222.092	222.093	194.331	0	194.331	0%	0%
BEI	1.054.748	1.054.748	1.054.748	0	1.054.748	0%	0%
Outras	115.142	115.142	286.182	9.902	134.213	9%	3%
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	-	-
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	10.452.935	10.452.275	13.468.423	564.290	3.493.897	5%	4%
Aquis. Bens de Investimento	413.254.412	360.768.978	362.983.728	20.587.823	235.437.337	5%	6%
Santo Ovídio - Vila d'Este (Amarela)	12.212.787	12.212.787	11.662.787	850.148	6.331.807	7%	7%
Casa da Música - São Bento (Rosa)	76.395.177	51.957.648	51.425.648	11.048.823	13.144.739	14%	21%
Casa da Música - Santo Ovídio (Rubi)	198.668.390	163.668.390	168.111.140	4.898.048	135.307.592	2%	3%
BRT Boavista - Império - Pç. Cid. Salv.	32.902.495	25.824.007	25.328.007	2.374.119	61.746	7%	9%
Gondomar II	8.262.998	8.262.998	7.932.149	461.920	7.418.870	6%	6%
Trofa	8.155.876	8.155.876	7.905.876	0	6.679.720	0%	0%
S. Mamede	786.009	786.009	586.009	0	226.240	0%	0%
Maia II	1.376.848	1.376.848	1.376.848	0	1.047.716	0%	0%
3ª Frota	1.780.701	1.780.701	1.780.701	80.202	763.715	5%	5%
4ª Frota	26.336.658	40.368.008	40.328.008	14.760	27.461.061	0%	0%
Outros	46.376.475	46.375.706	46.546.555	859.804	36.994.131	2%	2%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	513.204.726	460.713.908	470.003.684	34.739.695	283.141.695	7%	7%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	1.000	1.000	875	0	875	0%	0%
Banca Comercial	125.108.697	2.608.697	2.608.697	1.250.000	1.358.697	1%	48%
DGTF	87.500.000	0	0	0	-1.250.000	0%	-
BEI	0	0	0	0	0	-	-
Outras	2.608.697	2.608.697	2.608.697	0	2.608.697	0%	0%
Extraorçamentais	35.000.000	0	0	0	0	0%	-
