

Relatório de Execução Trimestral – 1ºT.2026

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final do mês (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2026	mar/2026	mar/2025	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4 467 957	3 033 192	3 403 985	-370 793
Propriedades de investimento	538 521	518 861	538 521	-19 660
Ativos intangíveis	2 606 901 202	2 202 267 987	2 072 899 050	129 368 937
Participações financeiras	3 649 521	1 845 861	2 670 977	-825 116
	2 615 557 202	2 207 665 901	2 079 512 533	128 153 368
Ativo corrente				
Cientes, contribuintes e utentes	5 671 123	1 775 893	1 511 454	264 439
Estado e outros entes públicos	11 898 692	10 018 233	7 907 901	2 110 332
Outras contas a receber	41 076 298	21 586 862	10 543 870	11 042 992
Diferimentos	68 098	6 660	27 058	-20 398
Caixa e depósitos	54 707 121	48 667 806	139 046 398	-90 378 592
	113 421 332	82 055 453	159 036 681	-76 981 228
Total do ativo	2 728 978 534	2 289 721 354	2 238 549 214	51 172 140
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	737 968 706	639 270 452	639 270 452	
Outros instrumentos de capital próprio	241 933	241 933	241 933	
Resultados transitados	-119 975 866	-93 752 739	-67 296 060	-26 456 679
Ajustamentos em ativos financeiros	-156 808	-330 015	-330 290	276
Subsídios ao investimento	1 650 727 200	1 123 111 861	1 002 767 159	120 344 702
Resultado líquido do período	-87 861 342	-12 693 941	-9 569 361	-3 124 580
Total do património líquido	2 180 943 824	1 655 847 552	1 565 083 833	90 763 719
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	399 323 338	493 369 586	497 741 845	-4 372 260
Financiamentos obtidos	58 695 638	113 804 335	118 913 032	-5 108 697
Outras contas a pagar		569 421	386 330	183 092
	458 018 976	607 743 342	617 041 207	-9 297 865
Passivo corrente				
Fornecedores	9 925 792	9 251 581	33 212 812	-23 961 231
Fornecedores de investimentos	13 946 501	7 674 538	9 875 157	-2 200 619
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		2 618		2 618
Estado e outros entes públicos		217 595	174 468	43 127
Financiamentos obtidos	57 812 012	3 952 129	4 434 922	-482 793
Outras contas a pagar	5 183 149	5 032 001	5 585 262	-553 261
Diferimentos	3 148 280		3 141 555	-3 141 555
	90 015 734	26 130 461	56 424 175	-30 293 714
Total do passivo	548 034 710	633 873 802	673 465 381	-39 591 579
Total do património líquido e passivo	2 728 978 534	2 289 721 354	2 238 549 214	51 172 140

➤ Entre março de 2025 e março de 2026, o Ativo aumentou em cerca de 51,2 M€, destacando-se sobretudo o aumento dos ativos intangíveis em 129,4 M€; a diminuição do valor de caixa de depósitos em cerca de -90,4 M€; e o crescimento da valor das outras contas a receber (+11,0 M€).

- O Património Líquido cresceu 90,8 M€, impulsionado pelo aumento dos subsídios ao investimento em mais 120,3 M€ e apesar do agravamento da rubrica de resultados transitados.
- O Passivo diminuiu em cerca de 39,6 M€, sobretudo devido à diminuição da dívida a fornecedores, incluindo os fornecedores de investimentos (-26,2 M€) e do passivo não corrente (-9,3 M€).

Demonstração de Resultados (valores em €)

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento Jan-Mar 2026	mar/26	mar/25	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)		51 266 853	41 705 143	
Serviços prestados (transporte)	20 093 207	18 673 409	17 049 941	1 623 468
Outras vendas e serviços prestados	804 383	487 505	357 678	129 827
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	371 916	874 101	493 894	380 207
Trabalhos para a própria entidade				
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)		-51 266 853	-41 705 143	
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-20 144 199	-18 260 604	-10 808 165	-7 452 439
Outros fornecimentos e serviços externos	-2 995 455	-1 892 641	-2 242 928	350 287
Gastos com o pessoal	-1 567 786	-1 662 503	-1 580 324	-82 179
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões líquidas				
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos			38 242	
Outros rendimentos e ganhos	5 744 979	7 276 397	4 616 208	2 660 190
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-20 000			
Outros gastos e perdas	-75 097	-120 930	-1 533 902	1 412 971
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	2 211 948	5 374 734	6 390 645	-1 015 911
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-22 328 642	-17 268 834	-14 952 675	-2 316 159
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-20 116 695	-11 894 100	-8 562 030	-3 332 070
Juros e rendimentos similares obtidos		1 542	12 620	-11 078
Juros e gastos similares suportados	-546 820	-801 383	-1 019 951	218 568
Atualização financeira das provisões				
Resultado antes de impostos	-20 663 514	-12 693 941	-9 569 361	-3 124 580
Imposto sobre o rendimento	-234 868			
Resultado líquido do período	-20 898 383	-12 693 941	-9 569 361	-3 124 580


- O resultado antes de depreciações e gastos de financiamento apurado em 2026 até final de março cifrou-se em cerca de 5,4 M€.
- No confronto com o período homólogo do ano passado, o resultado antes de depreciações e gastos de financiamento regista uma diminuição de cerca de 1,0 M€, devido ao agravamento dos custos suportados com o contrato de operação e manutenção (mais cerca de 7,5 M€).
- O valor das depreciações e amortizações aumentou em cerca de 2,3 M€.
- O resultado operacional foi negativo (-11,9 M€), denotando um agravamento de cerca de 3,3 M€.
- O valor referente a juros e gastos similares suportados diminuiu em cerca de 219 mil euros.

- O resultado líquido (resultado antes de impostos) apurado em 2026 até final de março cifrou-se em -12,7 M€, o que representa um agravamento de cerca de 3,1 M€ face ao apurado no período homólogo do ano passado.
- Em Anexo, apresenta-se o detalhe dos rendimentos e gastos de 2026, até final de março.

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2026	jan a mar-2026	jan a mar-2025	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	91 232 436	18 315 241	22 583 733	-4 268 492
Pagamentos a fornecedores	-116 951 417	-33 171 503	-14 986 051	-18 185 451
Pagamentos ao pessoal	-7 131 502	-1 372 434	-1 385 053	12 619
Pagamentos Transferencias e Subsídios	2 100 000	0	0	0
Caixa gerada pelas operações	-30 750 483	-16 228 695	6 212 629	-22 441 324
Outros recebimentos/pagamentos	40 103 228	-4 820 679	2 330 619	-7 151 298
Pagamentos/Recebimentos Imposto s/ rendimento	-1 074 156	6 938 102	0	6 938 102
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 278 589	-14 111 272	8 543 248	-22 654 520
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-1 433 162	-27 936	-19 469	-8 467
<i>Ativos intangíveis</i>	-528 359 703	-60 924 279	-17 386 217	-43 538 063
<i>Investimentos financeiros</i>	-28 900 000	0	0	0
Recebimentos provenientes de:				
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	0	0	0	0
<i>Ativos intangíveis</i>	0	0	0	0
<i>Investimentos financeiros</i>	0	0	0	0
<i>Subsídios ao investimento</i>	457 257 727	19 158 957	38 817 664	-19 658 707
<i>Dividendos</i>	0	0	0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-101 435 139	-41 793 258	21 411 979	-63 205 237
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
<i>Financiamentos obtidos</i>	2 703 315	0	0	
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>	98 698 254	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Financiamentos obtidos</i>	-5 108 697	-1 250 000	-1 250 000	0
<i>Juros e gastos similares</i>	-3 136 323	-581 403	-776 563	195 161
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	93 156 549	-1 831 403	-2 026 563	195 161
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	0	-57 735 932	27 928 664	-85 664 596
Efeitos das diferenças de câmbio			0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	54 707 121	2 503 738	12 817 734	-10 313 996
Caixa e seus equivalentes no fim do período	54 707 121	48 667 806	139 046 398	-90 378 592

Prazo Médio de Pagamentos

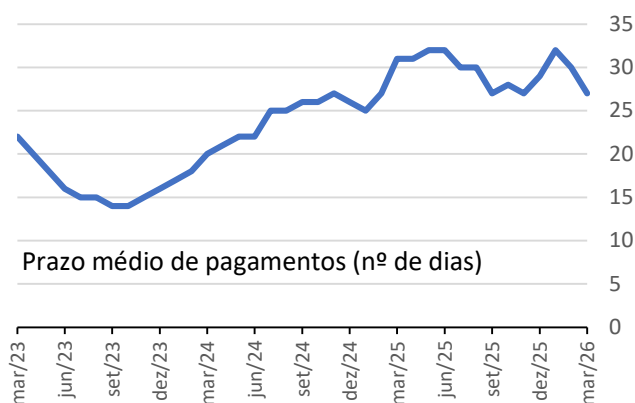

- Em março de 2026, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 27 dias, valor que compara com 30 dias no mês anterior e com 31 dias em março de 2025.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 1º trimestre de 2026, cifrou-se em 22 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, no final de março de 2026, uma execução de 21% face ao previsto no PAO 2026 e de 28% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
 - Para a execução orçamental da receita em 2026 até final de março, contribuíram sobretudo os ativos financeiros (98,9 M€), as transferências de capital recebidas (19,2 M€) e a receita tarifária (14,9 M€).
 - Do lado da Despesa, a execução orçamental em 2026 até final de março representou cerca de 14% face ao PAO 2026, e 19% em relação ao Orçamento do Estado.
 - Em fevereiro foi realizado o primeiro pedido de alteração orçamental relativo à Aplicação do Saldo de Gerência Transitado, no valor de 87,8M€, aprovado parcialmente a 3 de março em 83,9M€.
 - Em março foi realizado o segundo pedido de alteração orçamental relativo à abertura de um crédito especial no valor de 105,8M€.
-

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

➤ No final do 1º trimestre de 2026, as 26 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2026 cujo marco de concretização se encontrava previsto para o 1º trimestre, apresentavam a seguinte distribuição:

- 7 atividades já concluídas;
- 14 atividades que não tinham ainda sido concluídas;
- 5 atividades canceladas ou adiadas:

De seguida, apresenta-se o detalho de relatório trimestral de atividades.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
LINHA ROSA / LINHA AMARELA / MATERIAL CIRCULANTE CT				
GCPE	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha Rosa - Início da Operação Comercial	devia estar feito mas não está
GCPE	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Parque de Materiais e Oficinas de Vila D'Este - Início da Operação da Fase 2	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	SAE - PMO Vila D'Este - PMV 2ª FASE (Atualização Central e Periféricos)	cancelado/ adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	SCADA - PMO Vila D'Este - PMV 2ª FASE (Atualização Central e Ensaio Integrados RTU)	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rosa	devia estar feito mas não está
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistema SCADA da Linha Rosa	devia estar feito mas não está
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da linha Circular: Troço São Bento - Casa da Música - Especialidades - Prolongamento da Assistência Técnica	devia estar feito mas não está
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projetos de Execução de Arquitetura - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade/S.Bento - Boavista/Casa da Música - Prolongamento da Assistência Técnica	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Ligação ao CMIN - Assistência Técnica	cancelado/ adiado
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - PMO 2ª Fase - Reformulação do Projeto de Execução e Procedimento Concursal - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	VDE PMO II - Assistência Técnica a Projeto e Instalação	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Sistema de Elevação de Veículos (Eventuais Trabalhos Adicionais / Upgrades)	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Empilhador	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Inspeção Pantógrafo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Bancada de Ensaio de Freios	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Torno Mecânico	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	3º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Veículo Ferro/Rodoviário	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Shunter	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Veículo Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Equipamentos Vários	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Assistência Técnica aos Sistemas de Sinalização da Extensão a Vila de Este e Linha Rosa e Renovação da Rede Existente por Obsolescência - RESIG2	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistema de Sinalização - Linha Rosa (Casa da Música – São Bento) + Opção	prevê-se atrasos face ao prazo

LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR

GPC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento das Operações Aprovadas no PRR	
GCPE	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BRT 2 - Conclusão da Empreitada	prevê-se atrasos face ao prazo
GCPE	2º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianual)	Linha Rubi - Conclusão das Escavações dos Túneis e da Estrutura de Betão Armado ao Nível do Cais das 8 Estações	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema SCADA da Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Assistência Técnica	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da Linha Casa da Música - Santo Ovídio - Estação Campo Alegre e de 2 Poços de Emergência e Ventilação - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha Casa da Música - Santo Ovídio - Acompanhamento de Obra - ATE - Túnel	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	Intermédio (apenas para Anúncios)	Implementação e Monitorização da Integridade e Durabilidade Estrutural em Fase de Obra da Construção da Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	4º Trim.	Intermédio (apenas para Anúncios)	Fornecimento de Instrumentação para Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto do Parque de Estacionamento - Campo Alegre - Assistência Técnica	cancelado/ adiado
GPR	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT - Extensão a Matosinhos - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de Sinalização Linha Rubi- Infraestrutura	cancelado/ adiado
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade Estações BRT II (Antunes Guimarães - Anémoma)	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	BRT H2 - Arranque da Pré-Operação BRT - Fase II (Boavista - Anémoma)	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade na Linha Rubi (H) - Fase I (Gaia)	cancelado/ adiado
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	BRT H2 - Instalações Fotovoltaicas nos Carports STCP da Areosa e Via Norte - 2º fase	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GASQ	4º Trim.	Intermédio (apenas para Anúncios)	Monitorização Canforeira linha Rubi	

LINHA DE GONDOMAR: ESTÁDIO DO DRAGÃO - SOUTO / LINHA DA TROFA: ISMAI - MURO - PARADELA

GPC	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Submissão da Candidatura da linha da Trofa (ISMAI-Paradela) ao Sustentável 2030	já está feito
GPC	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Submissão da Candidatura da linha de Gondomar II (Estádio do Dragão - Souto) ao Sustentável 2030	já está feito
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA	já está feito
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradela (Metro + BRT)	já está feito

LINHA MAIA II: ROBERTO FRIAS - VERDES II / LINHA SÃO MAMEDE: HOSPITAL S. JOÃO - SRA. HORA - ESTÁDIO DO MAR

GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha S. Mamede + EIA	devia estar feito mas não está
-----	----------	-------------------------	--	--------------------------------

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo Extensão ao Aeroporto) + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo
PROJETOS				
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Elaboração do Projeto do Edifício Sede - Assistência Técnica	cancelado/ adiado
GPR	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA	cancelado/ adiado
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Passagem Superior de Pedras Rubras - Assistência Técnica	cancelado/ adiado
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução Ampliação do Topo Sul da Trindade	cancelado/ adiado
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução - Esquadra da Polícia Devesas	prevê-se que estará feito dentro do prazo
INFRAESTRUTURAS				
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pintura e Renovação das Juntas dos Vidros da Cobertura da Estação Aeroporto	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e Danos na Estação de Campanhã - Intervenção	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reparação de Infiltrações em St. Ovídio	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Telas da Cobertura do Interface Casa da Música	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Reabilitação	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reabilitação de PN's e Atravessamentos Rodoviários	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	1º Trim.	Adjudicação	Consultoria Especializada na Área de Via	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para Eliminação da Passagem de Nível	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Trabalhos de Adaptação da Infraestrutura para Libertar Gabarits (Adaptação Chapas Ponte Luiz I)	cancelado/ adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Eliminação de Passagens de Nível nas Linhas Verde e Vermelha (PS a Norte de Pedras Rubras)	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aquisição de Equipamentos de Apoio à Manutenção (Reforço) - Aspirail, Multifunções, Medição Geometria, Medição Desgaste	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Correções de Situações em Falta na ELA	prevê-se que estará feito dentro do prazo

SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DST	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Renovação Escadas Mecânicas e Elevadores SMLAMP	devia estar feito mas não está
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Novas Escadas Mecânicas e Renovação Elevadores existentes - Casa da Música	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Sistemas SAE (Câmaras Analógicas, Informação ao Público)	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de Rádio - Rede Privada	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Adjudicação	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto	devia estar feito mas não está
DST	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Novo PCC	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Quadros MT das Subestações de Tração e Postos de Transformação da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Proteções DC e Intertripping das Subestações de Tração da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Substituição de Catenária por Desgaste	devia estar feito mas não está
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação / Upgrade das Soluções de Iluminação para LED	devia estar feito mas não está
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Reformulação / Upgrade dos Sistemas de Alimentação Ocorrida (UPS) - DAP, Estações Subterrâneas	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Substituição Equipamentos e Sistemas Auxiliares (Grupo Retificador, Carregadores 110 Vdc e Carregadores 48 Vdc)	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração Estrutura e Ventilação de Elevadores Superfície	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento e Instalação de MVA's	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Migração do TMS para o Novo Sistema de Gestão de Circulação e Regulação	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade de Controladores de Semáforos Linha A (25) - Obsolescência - Nova Solução com C-ITS	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aquisição de Motores de AMV U50 (20) para Renovação (tipo HR)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

MATERIAL CIRCULANTE LRT

DEX	4º Trim.	Adjudicação	MC - Aquisição Componentes Críticos para ET, TT e EO	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	TT - Substituição de Foles de Articulação	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	ET - Aquisição de Foles de Articulação (237 Conjuntos)	cancelado/ adiado
DEX	4º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	F04 - Revisão de Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	F04 - Contratação Fiscalização Fabrico e Comissionamento	já está feito
DEX	4º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	F04 - Marco 4 - Contrato CRRC (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Sinalização Embarcada para Linha Rubi - F04 (18)	cancelado/ adiado
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Sinalização Embarcada ATP para Veículos F04 (4)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e Implementar Plataforma Integrada de Projetos	cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Implementar Plataforma Integrada de Projetos	
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novas Funcionalidades da Gestão da Manutenção	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Novas Funcionalidades da Gestão da Manutenção	
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Adaptação do Aplicação de Indicadores Contratuais (AIC)	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adaptação do Aplicação de Indicadores Contratuais (AIC)	
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar e implementar Plataforma de IoT	
GSI	4º Trim.	marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Avaliar e implementar Plataforma de IoT	
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e implementar Soluções de IA Generativa	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Implementar Soluções de IA Generativa	
GSI	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e Implementar Soluções de RA em Manutenção	
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)	

APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

GAC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Mapeamento em Base de Dados dos Ativos de Sinalética	
GAC	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente e Segurança	
GAC	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Ponto de Atendimento ao Cliente	
GAC	4º Trim.	Adjudicação	Introdução de IA na Atividade de Apoio ao Cliente	
GAC	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente	
DEX	4º Trim.	Adjudicação	Novo Contrato de Subconcessão	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Prorrogação Contrato Transportes Alternativos ou Lançamento de Nova Consulta	já está feito
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA				
GASQ	3º Trim.	Marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Mapeamento da Infraestrutura Verde e Monitorização InSAR	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Levantamento dos Exemplos Arbóreos, Influência Radicular Novos Projetos	
COMUNICAÇÃO				
GCCS	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Edição de Livro Sobre o Concurso Público da Ponte D. Antónia Ferreira	

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=25%
	ACUMULADO 2025	2026	até mar/26	até mar/26	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2 168 388 517	181 880	44 970	0	0%	0%
PROJETO INICIAL	1 506 805 476	179 880	44 970	0	0%	0%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	<i>1 484 486 049</i>	0	0	0	-	-
<i>Reabjamento Campanhã</i>	<i>17 050</i>	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	<i>22 302 377</i>	179 880	44 970	0	0%	0%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 591 255	0	0	0	-	-
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	0	-	-
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-
EXPANSÕES	1 113 371 023	456 458 727	149 615 926	50 934 462	34%	11%
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21 980 815	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70 144 087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36 639 298	0	0	0	-	-
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162 551 044	1 000	0	0	-	0%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45 663 894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718 994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	206 359 449	34 385 515	7 502 800	41 755	1%	0%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	321 836 743	78 757 225	66 130 169	13 556 889	21%	17%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	149 258 603	257 361 443	58 568 212	22 647 549	39%	9%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	38 742 474	17 018 129	7 680 347	14 261 185	186%	84%
LINHA DE GONDOMAR II	1 184 121	20 279 960	17 960	0	0%	0%
LINHA DA TROFA	695 244	20 279 600	17 600	371 710	2112%	2%
LINHA MAIA II	954 645	1 131 449	0	0	-	0%
LINHA SÃO MAMEDE	736 159	17 960	17 960	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	55 905 454	27 126 445	9 680 878	55 374	1%	0%
OUTROS ENCARGOS	56 875 044	44 937 532	11 138 182	335 286	3%	
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 465 708	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	159 161	2 600 000	650 000	0	0%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	5 023 043	13 875 018	4 855 018	524 364	11%	4%
INFRAESTRUTURAS	14 499 436	12 699 066	3 171 250	76 111	2%	1%
OUTROS ENCARGOS	25 516 340	10 667 193	1 197 600	-265 189	-22%	-2%
PCC E EDIFÍCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS	12 500	5 096 255	1 264 314	0	0%	0%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-23 006 084	0	0	0	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	40 400 559	2 963 608	216 050	156 292	72%	5%
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	3 994 422	1 000 000	0	0	-	0%
ATIVOS TANGÍVEIS	1 530 889	1 182 398	54 497	17 084	31%	1%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	2 387 614	0	0	126 710	-	-
INFORMÁTICA	494 813	781 210	161 553	2 748	2%	0%
DESPESAS GERAIS	34 207 082	0	0	9 750	-	-
TOTAL	3 379 035 143	504 541 746	161 015 128	51 426 041	32%	10%
Efeito Provisões	-20 595 094	0	0	0	-	-
Sem Efeito Provisões	3 399 630 237	504 541 746	161 015 128	51 426 041	32%	10%

ANEXO: FINANCIAMENTO

(valores em eur)								
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=25%	
	Contratado	Acumulado 2025	2026	até mar/26	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
FUNDOS NACIONAIS	744 463 793	553 303 484	169 567 944	200 000		74%		0%
PIDDAC / OE	362 083 874	215 590 048	149 651 801	200 000		60%		0%
PIDDAC SML e OC	118 148 358	117 348 358	800 000	200 000		99%		25%
PIDDAC Ponte do Infante	33 759 724	33 759 724	0	0		100%		-
PIDDAC Tram Train	8 000 000	8 000 000	0	0		100%		-
PIDDAC DJII-SO	5 000 000	5 000 000	0	0		100%		-
PIDDAC GONDOMAR	8 125 000	8 125 000	0	0		100%		-
OE Linha Amarela e Rosa	85 991 968	43 356 966	82 943 487	0		50%		0%
OE Rubi	96 000 000	0	58 749 490	0		0%		0%
OE BRT	7 058 824	0	7 058 824	0		0%		0%
Linha Circular (Casa da Música - Roberto Frias)	0	0	100 000	0		0%		0%
FUNDO AMBIENTAL	382 379 919	337 713 436	19 916 143	0		88%		0%
FA Linha Amarela e Rosa	260 700 000	260 700 000	0	0		100%		-
FA Material Circulante - 3ª Frota	25 390 084	26 600 000	0	0		105%		-
FA Material Circulante - 4ª Frota	40 242 000	5 365 600	2 682 800	0		13%		0%
FA Mobilidade Elétrica	2 000	2 000	0	0		100%		-
FA PEES	5 744 457	5 744 457	0	0		100%		-
FA Rubi	40 000 000	30 000 000	10 000 000	0		75%		0%
FA BRT	2 941 176	2 941 176	0	0		100%		-
FA Gondomar II, Trofa, S. Mamede, Maia II	7 360 203	6 360 203	7 233 343	0		86%		0%
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1 481 223 753	942 483 932	287 689 783	13 968 935		65%		5%
FEDER/FSE	369 058 643	369 058 643	0	0		100%		-
FEDER - QCA II	48 620 711	48 620 711	0	0		100%		-
FEDER - QCA III	320 224 279	320 224 279	0	0		100%		-
FSE - SAMA 2020	213 653	213 653	0	0		100%		-
FUNDO DE COESÃO	694 179 848	404 338 899	89 118 524	7 183 538		59%		8%
Dup. Póvoa e Aeroporto	67 681 903	67 681 903	0	0		100%		-
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104 950 763	104 950 763	0	0		100%		-
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	79 716 947	79 716 947	0	0		100%		-
POSEUR - Casa da Música - São Bento	86 830 235	86 830 235	0	0		100%		-
Sustentável 2030 - LR	96 000 000	65 159 051	30 199 253	4 896 417		73%		16%
Sustentável 2030 - 4ª Frota	34 000 000	0	24 443 645	2 287 122		7%		9%
Sustentável 2030 - Gondomar II *	130 000 000	0	17 237 966	0		0%		0%
Sustentável 2030 - Trofa *	95 000 000	0	17 237 660	0		0%		0%
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	417 985 261	169 086 389	198 571 259	6 785 397		42%		3%
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	351 985 261	130 857 417	188 611 954	0		37%		0%
PRR - BRT	66 000 000	38 228 973	9 959 305	6 785 397		68%		68%
OUTROS	689 392 175	639 512 386	98 698 254	0		93%		0%
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0		0%		-
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	241 933	241 933	0	0		100%		-
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0		0%		-
Património/capital	639 270 452	639 270 452	98 698 254	0		100%		0%
TOTAL	2 915 079 722	2 135 299 801	555 955 981	14 168 935		74%		3%

(valores em euros)

(valores em euros)								
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=25%	
	Contratado	Acumulado 2025	2026	até mar/26	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
DGTF	90 000 000	0	0	0		0%		-
BEI	33 913 032	33 913 032	-2 608 697	0		100%		0%
BANCA COMERCIAL	83 750 000	85 000 000	-2 500 000	-1 250 000		100%		50%
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	207 663 032	118 913 032	-5 108 697	-1 250 000		57%		24%

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]	
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=25%	
	2026	até mar/26	Execução do Orçamento	
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	2 100 000	0		0%
INCENTIVA+TP E OUTRAS COMPENSAÇÕES	25 427 607	2 840 733		11%
TOTAL	27 527 607	2 840 733		-

ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[4]/[1]	[4]/[3]
	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL	REAL	REAL	Duodécimo=25%	Duodécimo=25%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Liq. de Cativos	Execução até mar/26	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	703 500 963	432 161 481	524 932 203	144 814 674	0	21%	28%
Impostos Directos	0	0	0	0	0	-	-
Impostos Indirectos	0	0	0	0	0	-	-
Contrib.Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0	0	-	-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	328 096	2 338 597	2 338 597	311 858	0	95%	13%
Rendimentos da Propriedade	0	0	0	1 542	0	-	-
Transferências Correntes	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 317 103	0	110%	110%
Estado (Comparticipações Tarifárias - GPIAAAF)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0%	0%
Administração Local (Comparticipações Tarifárias - TMP)	0	0	0	2 317 103	0	-	-
Outras Transferências	0	0	0	0	0	-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	98 642 823	99 521 972	99 521 972	15 694 958	0	16%	16%
Aluguer de espaços e equipamentos	1 108 151	1 108 293	1 108 293	261 549	0	24%	24%
TSA	23 766 903	25 700 728	25 700 728	523 631	0	2%	2%
Outras (inclui Receita Tarifária)	73 767 769	72 712 951	72 712 951	14 909 778	0	20%	21%
Outras Receitas Correntes (inclui reembolsos IVA)	18 199 293	42 696 144	42 696 144	6 986 400	0	38%	16%
Venda Bens de Investimento	0	0	0	0	0	-	-
Transferências de Capital	457 257 727	212 646 214	217 636 237	19 158 957	0	4%	9%
Estado (PIDDAC e OE)	800 000	800 000	800 000	200 000	0	25%	25%
Sustentável 2030	89 118 524	89 118 524	89 118 524	7 183 538	0	8%	8%
PRR	198 571 259	105 227 690	110 217 713	11 775 419	0	6%	11%
Fundo Ambiental	19 916 143	17 500 000	17 500 000	0	0	0%	0%
Outras Transferências (incl. POSEUR)	148 851 801	0	0	0	0	0%	-
Outras Receitas de Capital	25 571 454	0	0	0	0	0%	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	206 138	0	-	-
Activos Financeiros	0	0	86 552 957	98 909 978	0	-	114%
Passivos Financeiros	101 401 569	72 858 554	72 858 554	0	0	0%	0%
Empréstimos (DGTF)	2 703 315	2 704 000	2 704 000	0	0	0%	0%
Realizações de Capital (DGTF)	98 698 254	70 154 554	70 154 554	0	0	0%	0%
Saldo Gerência Anterior	0	0	1 227 742	1 227 740	0	-	100%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-
DESPESA	703 500 963	432 161 481	504 680 774	97 511 263	297 705 039	14%	19%
Despesas com Pessoal	6 805 568	6 805 569	6 805 569	1 428 800	4 896 250	21%	21%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	123 027 535	108 103 487	125 046 684	25 225 791	79 174 816	21%	20%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	122 823 270	82 000 879	97 879 553	22 633 821	64 018 604	18%	23%
Outras	204 265	26 102 608	27 167 131	2 591 970	15 156 212	1269%	10%
Juros e Outros Encargos	3 135 823	3 135 823	3 355 443	570 875	2 664 328	18%	17%
Banca Comercial	2 005 014	2 005 014	2 005 014	537 786	1 467 228	27%	27%
DGTF	0	0	0	0	0	-	-
BEI	979 408	979 409	979 409	0	979 409	0%	0%
Outras	151 400	151 400	371 020	33 089	217 692	22%	9%
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	-	-
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	6 730 475	17 839 435	1 457 440	62 322	1 107 747	1%	4%
Aquis. Bens de Investimento	529 792 866	258 041 286	329 779 757	68 973 475	172 876 017	13%	21%
Santo Ovídio - Vila d'Este (Amarela)	35 623 523	1 090 179	923 317	46 930	40	0%	5%
Casa da Música - São Bento (Rosa)	81 176 764	32 349 021	68 597 723	18 451 161	16 107 969	23%	27%
Casa da Música - Santo Ovídio (Rubi)	262 697 980	115 549 839	126 282 288	37 543 706	71 631 821	14%	30%
BRT Boavista - Império - Pç. Cid. Salv.	19 526 731	5 299 614	30 746 155	10 879 007	8 172 102	56%	35%
Gondomar II	20 914 162	18 357 528	18 342 368	0	18 013 779	0%	0%
Trofa	20 905 008	20 496 111	19 016 211	362 334	18 297 677	2%	2%
S. Mamede	150 802	133 989	872 961	0	118 031	0%	0%
Maia II	1 396 806	1 241 066	1 966 834	0	235 770	0%	0%
3ª Frota	48 061 719	0	139 482	0	0	0%	0%
4ª Frota	32 542 584	31 639 579	32 542 584	44 280	28 020 905	0%	0%
Outros	6 796 786	31 884 360	30 349 834	1 646 057	12 277 923	24%	5%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0%	0%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	33 008 697	1 000 000	37 235 881	1 250 000	35 985 881	4%	3%
Banca Comercial	2 500 000	37 235 881	2 500 000	1 250 000	1 250 000	50%	50%
DGTF	0	2 500 000	0	0	0	-	-
BEI	2 608 697	0	2 608 697	0	2 608 697	0%	0%
Outras	27 900 000	2 608 697	32 127 184	0	32 127 184	0%	0%
Extraorçamentais	0	32 127 184	0	0	0	-	-

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	mar/26	[1]		[2]		[3]		[4]		[1]-[3]		[2]-[4]	
		RECEITA				DESPESA				SALDO			
		Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos
313 - Saldos de RI não afetados a projetos cofinanciados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades		0	180 230	0	0	0	0	0	0	0	0	180 230	0
318 - RI - Indemn. Compens. não afetados a projetos cofina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319 - Transferências de RI entre organismos		0	200 000	0	180 065	0	180 065	0	0	0	0	19 935	0
31B - Transferências de RI - PRR - Empréstimos		0	12 357 022	0	37 560 749	0	37 560 749	0	0	0	0	-25 203 726	0
357 - RI afetados a projetos cofinanciados-PRR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 - RP afetados a projetos cofinanciados-FSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368 - Saldos de RP afetados a projetos cofinanciados (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 - Feder - Norte 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 - Fundo de Coesão - SEUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434 - Fundo Coesão PT 2030		0	7 183 538	0	14 410 061	0	14 410 061	0	0	0	0	-7 226 522	0
441 - FSE - Competitividade e Internacionalização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência		0	6 785 397	0	2 881 163	0	2 881 163	0	0	0	0	3 904 234	0
484 - PRR - Subvenções IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488 - Saldos de Fundos Europeus		0	3 864 102	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864 102	0
48A - Saldos de PRR - Subvenções		0	4 990 022	0	1 092 393	0	1 092 393	0	0	0	0	3 897 629	0
513 - RP do ano - com outras origens		18 579 897	6 938 102	26 578 705	4 165 048	0	4 165 048	0	0	-7 998 808	0	2 773 054	0
521 - RG - Com origem em RG provenientes do OE (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522 - Saldos de RP transitados - com outras origens		15 878 674	67 857 690	0	5 008 731	0	5 008 731	0	0	15 878 674	0	62 848 958	0
540 - Transferências de RP entre organismos - FA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 - Transferências de RP entre organismos		0	0	0	0	0	2 531 011	0	0	0	0	-2 531 011	0
713 - Entidade da A.C. - Com origem em receitas gerais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721 - Entidade da AC - Com origem receitas de impostos		0	0	0	3 103 337	0	3 103 337	0	0	0	0	-3 103 337	0
