

Relatório de Execução Trimestral – 2ºT.2026

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final do mês (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2026	jun/2026	jun/2025	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4 467 957	2 937 545	3 346 524	-408 979
Propriedades de investimento	538 521	514 928	538 521	-23 593
Ativos intangíveis	2 606 901 202	2 249 503 584	2 090 398 763	159 104 821
Participações financeiras	3 649 521	1 845 861	2 670 977	-825 116
	2 615 557 202	2 254 801 918	2 096 954 786	157 847 133
Ativo corrente				
Cientes, contribuintes e utentes	5 671 123	2 512 929	1 218 627	1 294 302
Estado e outros entes públicos	11 898 692	7 821 298	6 209 299	1 611 999
Outras contas a receber	41 076 298	24 484 467	11 332 138	13 152 330
Diferimentos	68 098	7 418	27 202	-19 785
Caixa e depósitos	54 707 121	77 750 048	94 493 546	-16 743 499
	113 421 332	112 576 159	113 280 813	-704 653
Total do ativo	2 728 978 534	2 367 378 078	2 210 235 598	157 142 480
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	737 968 706	639 270 452	639 270 452	
Outros instrumentos de capital próprio	241 933	241 933	241 933	
Resultados transitados	-119 975 866	-93 752 739	-67 296 060	-26 456 679
Ajustamentos em ativos financeiros	-156 808	-330 015	-330 290	276
Subsídios ao investimento	1 650 727 200	1 205 057 512	1 008 913 825	196 143 687
Resultado líquido do período	-87 861 342	-24 198 372	-20 025 844	-4 172 528
Total do património líquido	2 180 943 824	1 726 288 772	1 560 774 016	165 514 755
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	399 323 338	493 369 586	496 433 789	-3 064 204
Financiamentos obtidos	58 695 638	113 804 335	118 913 032	-5 108 697
Outras contas a pagar		774 271	392 791	381 480
	458 018 976	607 948 191	615 739 612	-7 791 420
Passivo corrente				
Fornecedores	9 925 792	16 067 056	4 209 738	11 857 318
Fornecedores de investimentos	13 946 501	11 551 405	18 493 342	-6 941 938
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		4 154		4 154
Estado e outros entes públicos		375 017	343 686	31 330
Financiamentos obtidos	57 812 012	1 285 676	1 826 225	-540 549
Outras contas a pagar	5 183 149	3 857 808	5 707 424	-1 849 616
Diferimentos	3 148 280		3 141 555	-3 141 555
	90 015 734	33 141 115	33 721 970	-580 856
Total do passivo	548 034 710	641 089 306	649 461 582	-8 372 276
Total do património líquido e passivo	2 728 978 534	2 367 378 078	2 210 235 598	157 142 480

- Entre junho de 2025 e junho de 2026, o Ativo aumentou em cerca de 157,1 M€, destacando-se sobretudo o aumento dos ativos intangíveis em 159,1 M€ e a diminuição do valor de caixa e depósitos (-16,7 M€). O total a receber de Cientes, do Estado e de outras contas aumentou em 16,1 M€.

- O Património Líquido cresceu 165,5 M€, impulsionado pelo aumento dos subsídios ao investimento em mais 196,1 M€ e apesar do agravamento da rubrica de resultados transitados.
- O Passivo diminuiu em cerca de 8,4 M€, sobretudo devido à diminuição do passivo não corrente em cerca de 7,8 M€.

Demonstração de Resultados (valores em €)

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento Jan-Jun 2026	jun/26	jun/25	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)		115 512 436	76 800 736	
Serviços prestados (transporte)	41 572 939	39 351 360	31 949 328	7 402 032
Outras vendas e serviços prestados	1 577 602	1 168 403	753 064	415 339
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	770 145	1 437 892	993 276	444 616
Trabalhos para a própria entidade			3 976	
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)		-115 512 436	-76 800 736	
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-41 394 449	-37 537 209	-22 785 048	-14 752 161
Outros fornecimentos e serviços externos	-5 905 765	-4 005 034	-3 862 415	-142 619
Gastos com o pessoal	-3 587 140	-3 382 892	-3 197 451	-185 441
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		2 005		
Provisões líquidas				
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos			173 128	
Outros rendimentos e ganhos	11 494 054	15 043 054	9 583 397	5 459 657
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-40 000			
Outros gastos e perdas	-223 686	-210 756	-252 323	41 568
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	4 263 701	11 866 822	13 358 931	-1 492 108
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-44 657 285	-34 426 884	-31 346 796	-3 080 088
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-40 393 583	-22 560 062	-17 987 865	-4 572 196
Juros e rendimentos similares obtidos		0	12 620	-12 620
Juros e gastos similares suportados	-2 111 512	-1 638 311	-2 050 599	412 288
Atualização financeira das provisões				
Resultado antes de impostos	-42 505 095	-24 198 372	-20 025 844	-4 172 528
Imposto sobre o rendimento	-537 385			
Resultado líquido do período	-43 042 481	-24 198 372	-20 025 844	-4 172 528


- O resultado antes de depreciações e gastos de financiamento apurado em 2026 até final de junho cifrou-se em cerca de 11,9 M€.
- No confronto com o período homólogo do ano passado, o resultado antes de depreciações e gastos de financiamento regista uma diminuição de cerca de 1,5 M€. O forte agravamento dos custos suportados com o contrato de operação e manutenção (mais 14,8 M€) foi compensado pelo aumento dos rendimentos provenientes dos serviços de transporte prestados (+7,4 M€) e dos “outros rendimentos e ganhos” (+5,5 M€).
- O valor das depreciações e amortizações aumentou em cerca de 3,1 M€.
- O resultado operacional foi negativo (-22,6 M€), denotando um agravamento de cerca de 4,6 M€.
- O valor referente a juros e gastos similares suportados diminuiu em cerca de 412 mil euros.

- O resultado líquido (resultado antes de impostos) apurado em 2026 até ao final de junho cifrou-se em -24,2 M€, o que representa um agravamento de cerca de 4,2 M€ face ao apurado no período homólogo do ano passado.
- Em Anexo, apresenta-se o detalhe dos rendimentos e gastos de 2026, até final de junho.

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2026	jan a jun-2026	jan a jun-2025	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	91 232 436	38 874 468	39 798 496	-924 029
Pagamentos a fornecedores	-116 951 417	-59 712 319	-44 361 143	-15 351 176
Pagamentos ao pessoal	-7 131 502	-2 952 623	-2 997 290	44 667
Pagamentos Transferencias e Subsídios	2 100 000	0	0	0
Caixa gerada pelas operações	-30 750 483	-23 790 474	-7 559 937	-16 230 538
Outros recebimentos/pagamentos	40 103 228	-4 661 527	7 069 752	-11 731 279
Pagamentos/Recebimentos Imposto s/ rendimento	-1 074 156	13 799 313	0	13 799 313
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 278 589	-14 652 688	-490 184	-14 162 503
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-1 433 162	-92 629	-58 770	-33 860
Ativos intangíveis	-528 359 703	-115 614 981	-58 902 314	-56 712 667
Investimentos financeiros	-28 900 000	0	0	0
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios ao investimento	457 257 727	107 740 377	49 324 344	58 416 033
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-101 435 139	-7 967 234	-9 636 739	1 669 506
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Financiamentos obtidos	2 703 315	0	0	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	98 698 254	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-5 108 697	-3 858 697	-3 858 697	0
Juros e gastos similares	-3 136 323	-2 175 072	-2 638 567	463 495
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	93 156 549	-6 033 769	-6 497 264	463 495
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	0	-28 653 690	-16 624 188	-12 029 503
Efeitos das diferenças de câmbio			-1	1
Caixa e seus equivalentes no início do período	54 707 121	2 503 738	12 817 734	-10 313 996
Caixa e seus equivalentes no fim do período	54 707 121	77 750 048	94 493 546	-16 743 499

Prazo Médio de Pagamentos

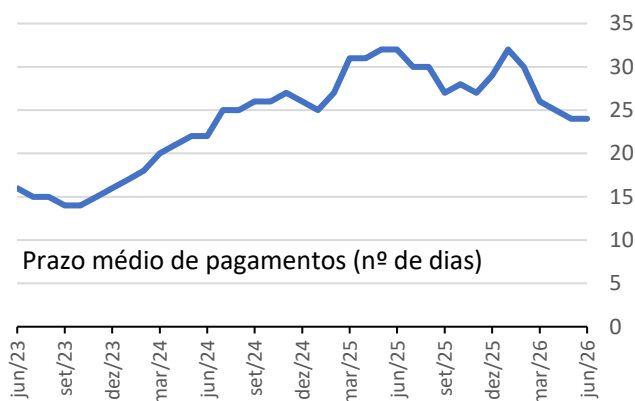

- Em junho de 2026, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 24 dias, valor idêntico ao registado no mês anterior e que compara com 32 dias em junho de 2025.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 2º trimestre de 2026, cifrou-se em 23 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, no final de junho de 2026, uma execução de 37% face ao previsto no PAO 2026 e de 50% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
 - Para a execução orçamental da receita em 2026 até final de junho, contribuíram sobretudo as transferências de capital recebidas (107,7 M€), os ativos financeiros (98,9 M€), e a receita de vendas e serviços correntes (31,0 M€).
 - Do lado da Despesa, a execução orçamental em 2026 até final de junho representou cerca de 26% face ao PAO 2026, e 37% em relação ao Orçamento do Estado.
 - Em fevereiro, foi realizado o primeiro pedido de alteração orçamental relativo à Aplicação do Saldo de Gerência Transitado, no valor de 87,8M€, aprovado parcialmente em março pelo valor de 83,9M€.
 - Em março, foi realizado o segundo pedido de alteração orçamental relativo à abertura de um crédito especial no valor de 105,8M€, o qual aguarda aprovação.
 - Em abril, foi realizado o terceiro pedido de alteração orçamental relativo à Aplicação do Saldo de Gerência Transitado no valor de 3,9M€, aprovado em junho e comunicado à Empresa já em julho.
-

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

➤ No final do 2º trimestre de 2026, as 48 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2026 cujo marco de concretização se encontrava previsto para o 1º ou para o 2º trimestre, apresentavam a seguinte distribuição:

- 11 atividades já concluídas;
- 12 atividades que não tinham ainda sido concluídas;
- 8 atividades canceladas ou adiadas;
- 17 atividades em relação às quais não foi possível obter informação.

De seguida, apresenta-se o detalhe do relatório trimestral de atividades.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
LINHA ROSA / LINHA AMARELA / MATERIAL CIRCULANTE CT					
GCPE	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha Rosa - Início da Operação Comercial	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GCPE	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Parque de Materiais e Oficinas de Vila D'Este - Início da Operação da Fase 2	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	SAE - PMO Vila D'Este - PMV 2ª FASE (Atualização Central e Periféricos)	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	SCADA - PMO Vila D'Este - PMV 2ª FASE (Atualização Central e Ensaios Integrados RTU)	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rosa	devia estar feito mas não está	
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistema SCADA da Linha Rosa	devia estar feito mas não está	
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da linha Circular: Troço São Bento - Casa da Música - Especialidades - Prolongamento da Assistência Técnica	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projetos de Execução de Arquitetura - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade/S.Bento - Boavista/Casa da Música - Prolongamento da Assistência Técnica	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Ligação ao CMIN - Assistência Técnica	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - PMO 2ª Fase - Reformulação do Projeto de Execução e Procedimento Concursal - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	VDE PMO II - Assistência Técnica a Projeto e Instalação	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Sistema de Elevação de Veículos (Eventuais Trabalhos Adicionais / Upgrades)	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Empilhador	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Inspeção Pantógrafo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Bancada de Ensaio de Freios	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Torno Mecânico	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	3º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Veículo Ferro/Rodoviário	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Shunter	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Veículo Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	VDE PMO II - EO - Equipamentos Vários	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Assistência Técnica aos Sistemas de Sinalização da Extensão a Vila de Este e Linha Rosa e Renovação da Rede Existente por Obsolescência - RESIG2	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Sistema de Sinalização - Linha Rosa (Casa da Música – São Bento) + Opção	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está

LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR

GPC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento das Operações Aprovadas no PRR		
GCPE	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BRT 2 - Conclusão da Empreitada	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GCPE	2º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Linha Rubi - Conclusão das Escavações dos Túneis e da Estrutura de Betão Armado ao Nível do Cais das 8 Estações	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistemas de Apoio à Exploração da Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema SCADA da Linha Rubi	prevê-se atrasos face ao prazo	
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Assistência Técnica	devia estar feito mas não está	já está feito
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da Linha Casa da Música - Santo Ovídio - Estação Campo Alegre e de 2 Poços de Emergência e Ventilação - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha Casa da Música - Santo Ovídio - Acompanhamento de Obra - ATE - Túnel	prevê-se atrasos face ao prazo	
GPR	4º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Implementação e Monitorização da Integridade e Durabilidade Estrutural em Fase de Obra da Construção da Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Fornecimento de Instrumentação para Ponte Ferreirinha	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto do Parque de Estacionamento - Campo Alegre - Assistência Técnica	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GPR	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT - Extensão a Matosinhos - Assistência Técnica	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de Sinalização Linha Rubi- Infraestrutura	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade Estações BRT II (Antunes Guimarães - Anémoma)	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	BRT H2 - Arranque da Pré-Operação BRT - Fase II (Boavista - Anémoma)	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade na Linha Rubi (H) - Fase I (Gaia)	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	BRT H2 - Instalações Fotovoltaicas nos Carports STCP da Areosa e Via Norte - 2º fase	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GASQ	4º Trim.	marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Monitorização Canforeira linha Rubi		

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
LINHA DE GONDOMAR: ESTÁDIO DO DRAGÃO - SOUTO / LINHHA DA TROFA: ISMAI - MURO - PARADELA					
GPC	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Submissão da Candidatura da linha da Trofa (ISMAI-Paradela) ao Sustentável 2030	já está feito	já está feito
GPC	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Submissão da Candidatura da linha de Gondomar II (Estádio do Dragão - Souto) ao Sustentável 2030	já está feito	já está feito
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA	já está feito	já está feito
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradela (Metro + BRT)	já está feito	já está feito
LINHA MAIA II: ROBERTO FRIAS - VERDES II / LINHA SÃO MAMEDE: HOSPITAL S. JOÃO - SRA. HORA - ESTÁDIO DO MAR					
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha S. Mamede + EIA	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo Extensão ao Aeroporto) + EIA	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
PROJETOS					
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Elaboração do Projeto do Edifício Sede - Assistência Técnica	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GPR	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Passagem Superior de Pedras Rubras - Assistência Técnica	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DIN	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução Ampliação do Topo Sul da Trindade	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução - Esquadra da Polícia Devesas	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
INFRAESTRUTURAS					
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pintura e Renovação das Juntas dos Vidros da Cobertura da Estação Aeroporto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e Danos na Estação de Campanhã - Intervenção	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reparação de Infiltrações em St. Ovídio	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de Telas da Cobertura do Interface Casa da Música	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Reabilitação	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reabilitação de PN's e Atravessamentos Rodoviários	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	1º Trim.	Adjudicação	Consultoria Especializada na Área de Via	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para Eliminação da Passagem de Nível	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Trabalhos de Adaptação da Infraestrutura para Libertar Gabarits (Adaptação Chapas Ponte Luiz I)	cancelado/ adiado	cancelado/ adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Eliminação de Passagens de Nível nas Linhas Verde e Vermelha (PS a Norte de Pedras Rubras)	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aquisição de Equipamentos de Apoio à Manutenção (Reforço) - Aspirail, Multifunções, Medição Geometria, Medição Desgaste	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Correções de Situações em Falta na ELA	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DST	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Renovação Escadas Mecânicas e Elevadores SMLAMP	devia estar feito mas não está	
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Novas Escadas Mecânicas e Renovação Elevadores existentes - Casa da Música	devia estar feito mas não está	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Sistemas SAE (Câmaras Analógicas, Informação ao Público)	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de Rádio - Rede Privada	prevê-se atrasos face ao prazo	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DST	1º Trim.	Adjudicação	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto	devia estar feito mas não está	
DST	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Novo PCC	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Quadros MT das Subestações de Tração e Postos de Transformação da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação Proteções DC e Intertipping das Subestações de Tração da Linha Amarela	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Substituição de Catenária por Desgaste	devia estar feito mas não está	
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Renovação / Upgrade das Soluções de Iluminação para LED	devia estar feito mas não está	
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Reformulação / Upgrade dos Sistemas de Alimentação Ocorrida (UPS) - DAP, Estações Subterrâneas	devia estar feito mas não está	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Substituição Equipamentos e Sistemas Auxiliares (Grupo Retificador, Carregadores 110 Vdc e Carregadores 48 Vdc)	prevê-se atrasos face ao prazo	
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração Estrutura e Ventilação de Elevadores Superfície	prevê-se que estará feito dentro do prazo	
DST	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento e Instalação de MVA's	prevê-se atrasos face ao prazo	
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Migração do TMS para o Novo Sistema de Gestão de Circulação e Regulação	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade de Controladores de Semáforos Linha A (25) - Obsolescência - Nova Solução com C-ITS	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aquisição de Motores de AMV U50 (20) para Renovação (tipo HR)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

MATERIAL CIRCULANTE LRT

DEX	4º Trim.	Adjudicação	MC - Aquisição Componentes Críticos para ET, TT e EO	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Adjudicação	TT - Substituição de Foles de Articulação	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DEX	4º Trim.	Adjudicação	ET - Aquisição de Foles de Articulação (237 Conjuntos)	cancelado/ adiado	cancelado/ adiado
DEX	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	F04 - Revisão de Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	F04 - Contratação Fiscalização Fabrico e Comissionamento	já está feito	já está feito
DEX	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	F04 - Marco 4 - Contrato CRRC (22+10)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Sinalização Embarcada para Linha Rubi - F04 (18)	cancelado/ adiado	cancelado/ adiado
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Sinalização Embarcada ATP para Veículos F04 (4)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e Implementar Plataforma Integrada de Projetos	cancelado/ adiado	cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Implementar Plataforma Integrada de Projetos		
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novas Funcionalidades da Gestão da Manutenção		já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Novas Funcionalidades da Gestão da Manutenção		
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)		cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementação de Zero Trust Architecture (ZTA)		
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética	já está feito	já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Integração de Inteligência Artificial na Segurança Cibernética		
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Adaptação do Aplicação de Indicadores Contratuais (AIC)		já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adaptação do Aplicação de Indicadores Contratuais (AIC)		
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar e implementar Plataforma de IoT		cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	marco Intermediário (apenas para plurianual)	Avaliar e implementar Plataforma de IoT		
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e implementar Soluções de IA Generativa		cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Implementar Soluções de IA Generativa		
GSI	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Avaliar e Implementar Soluções de RA em Manutenção		
GSI	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)		cancelado/ adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver Análises de Dados Avançada e BI (Business Intelligence)		

APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

GAC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Mapeamento em Base de Dados dos Ativos de Sinalética		
GAC	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente e Segurança		
GAC	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Ponto de Atendimento ao Cliente		
GAC	4º Trim.	Adjudicação	Introdução de IA na Atividade de Apoio ao Cliente		
GAC	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente		
DEX	4º Trim.	Adjudicação	Novo Contrato de Subconcessão	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Prorrogação Contrato Transportes Alternativos ou Lançamento de Nova Consulta	já está feito	já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA					
GASQ	3º Trim.	Marco Intermédio (apenas para pluriannuals)	Mapeamento da Infraestrutura Verde e Monitorização InSAR		
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para pluriannuals)	Levantamento dos Exemplos Arbóreos, Influencia Radicular Novos Projetos		
COMUNICAÇÃO					
GCCS	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Edição de Livro Sobre o Concurso Público da Ponte D. Antónia Ferreira		prevê-se que estará feito dentro do prazo

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

						(valores em eur)
INVESTIMENTO	[1] REAL	[2] PREVISÃO	[3] PREVISÃO	[4] REAL	[4]/[3]	[4]/[2] Duodécimo=50%
	ACUMULADO 2025	2026	até jun/ 26	até jun/ 26	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2 168 388 517	181 880	91 940	88 228	 96%	 49%
PROJETO INICIAL	1 506 805 476	179 880	89 940	88 228	 98%	 49%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1 484 486 049	0	0	0	-	-
<i>Reabjamento Campanhã</i>	17 050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	22 302 377	179 880	89 940	88 228	 98%	 49%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 591 255	0	0	0	-	-
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	0	-	-
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-
EXPANSÕES	1 113 371 023	456 458 727	242 108 183	113 447 217	 47%	 25%
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21 980 815	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70 144 087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36 639 298	0	0	0	-	-
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162 551 044	1 000	1 000	0	 0%	 0%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45 663 894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718 994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	206 359 449	34 385 515	15 493 600	70 898	 0%	 0%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	321 836 743	78 757 225	69 732 143	35 794 831	 51%	 45%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	149 258 603	257 361 443	116 646 541	54 795 496	 47%	 21%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	38 742 474	17 018 129	15 481 594	18 631 541	 120%	 109%
LINHA DE GONDOMAR II	1 184 121	20 279 960	17 960	11 623	 65%	 0%
LINHA DA TROFA	695 244	20 279 600	17 600	561 446	 3190%	 3%
LINHA MAIA II	954 645	1 131 449	758 340	325 929	 43%	 29%
LINHA SÃO MAMEDE	736 159	17 960	17 960	0	 0%	 0%
MATERIAL CIRCULANTE	55 905 454	27 126 445	23 941 445	3 255 454	 14%	 12%
OUTROS ENCARGOS	56 875 044	44 937 532	21 158 746	2 146 897	 10%	
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 465 708	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	159 161	2 600 000	1 300 000	0	 0%	 0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	5 023 043	13 875 018	7 625 018	1 095 225	 14%	 8%
INFRAESTRUTURAS	14 499 436	12 699 066	6 342 500	907 305	 14%	 7%
OUTROS ENCARGOS	25 516 340	10 667 193	3 349 600	-35 832	 -1%	 0%
PCC E EDIFÍCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS	12 500	5 096 255	2 541 628	180 199	 7%	 4%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-23 006 084	0	0	0	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	40 400 559	2 963 608	1 670 842	37 766	 2%	 1%
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	3 994 422	1 000 000	1 000 000	0	 0%	 0%
ATIVOS TANGÍVEIS	1 530 889	1 182 398	272 737	23 202	 9%	 2%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	2 387 614	0	0	0	-	-
INFORMÁTICA	494 813	781 210	398 105	4 814	 1%	 1%
DESPESAS GERAIS	34 207 082	0	0	9 750	-	-
TOTAL	3 379 035 143	504 541 746	265 029 710	115 720 108	 44%	 23%
Efeito Provisões	-20 595 094	0	0	0	-	-
Sem Efeito Provisões	3 399 630 237	504 541 746	265 029 710	115 720 108	 44%	 23%

ANEXO: FINANCIAMENTO

	(valores em eur)						
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1] REAL	[2] REAL	[3] PREVISÃO	[4] REAL	[(4)+[2)]/[1]	[4]/[3]	
	Contratado	Acumulado 2025	2026	até jun/26	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	Duodécimo=50%
FUNDOS NACIONAIS	744 463 793	553 303 484	169 567 944	466 667	 74%	 0%	
PIDDAC / OE	362 083 874	215 590 048	149 651 801	466 667	 60%	 0%	
PIDDAC SML e OC	118 148 358	117 348 358	800 000	466 667	 100%	 58%	
PIDDAC Ponte do Infante	33 759 724	33 759 724	0	0	 100%	 -	
PIDDAC Tram Train	8 000 000	8 000 000	0	0	 100%	 -	
PIDDAC DJII-SO	5 000 000	5 000 000	0	0	 100%	 -	
PIDDAC GONDOMAR	8 125 000	8 125 000	0	0	 100%	 -	
OE Linha Amarela e Rosa	85 991 968	43 356 966	82 943 487	0	 50%	 0%	
OE Rubi	96 000 000	0	58 749 490	0	 0%	 0%	
OE BRT	7 058 824	0	7 058 824	0	 0%	 0%	
Linha Circular (Casa da Música - Roberto Frias)	0	0	100 000	0	 0%	 0%	
FUNDO AMBIENTAL	382 379 919	337 713 436	19 916 143	0	 88%	 0%	
FA Linha Amarela e Rosa	260 700 000	260 700 000	0	0	 100%	 -	
FA Material Circulante - 3ª Frota	25 390 084	26 600 000	0	0	 105%	 -	
FA Material Circulante - 4ª Frota	40 242 000	5 365 600	2 682 800	0	 13%	 0%	
FA Mobilidade Eléctrica	2 000	2 000	0	0	 100%	 -	
FA PEES	5 744 457	5 744 457	0	0	 100%	 -	
FA Rubi	40 000 000	30 000 000	10 000 000	0	 75%	 0%	
FA BRT	2 941 176	2 941 176	0	0	 100%	 -	
FA Gondomar II, Trofa, S. Mamede, Maia II	7 360 203	6 360 203	7 233 343	0	 86%	 0%	
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1 481 223 753	942 483 932	287 689 783	102 283 688	 71%	 36%	
FEDER/FSE	369 058 643	369 058 643	0	0	 100%	 -	
FEDER - QCA II	48 620 711	48 620 711	0	0	 100%	 -	
FEDER - QCA III	320 224 279	320 224 279	0	0	 100%	 -	
FSE - SAMA 2020	213 653	213 653	0	0	 100%	 -	
FUNDO DE COESÃO	694 179 848	404 338 899	89 118 524	17 712 045	 61%	 20%	
Dup. Póvoa e Aeroporto	67 681 903	67 681 903	0	0	 100%	 -	
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104 950 763	104 950 763	0	0	 100%	 -	
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	79 716 947	79 716 947	0	0	 100%	 -	
POSEUR - Casa da Música - São Bento	86 830 235	86 830 235	0	0	 100%	 -	
Sustentável 2030 - LR	96 000 000	65 159 051	30 199 253	13 067 388	 81%	 43%	
Sustentável 2030 - 4ª Frota	34 000 000	0	24 443 645	4 644 657	 14%	 19%	
Sustentável 2030 - Gondomar II	130 000 000	0	17 237 966	0	 0%	 0%	
Sustentável 2030 - Trofa	95 000 000	0	17 237 660	0	 0%	 0%	
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	417 985 261	169 086 389	198 571 259	84 571 643	 61%	 43%	
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	351 985 261	130 857 417	188 611 954	72 546 626	 58%	 38%	
PRR - BRT	66 000 000	38 228 973	9 959 305	12 025 017	 76%	 121%	
OUTROS	689 392 175	639 512 386	98 698 254	0	 93%	 0%	
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0	 0%	 -	
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	241 933	241 933	0	0	 100%	 -	
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0	 0%	 -	
Património/capital	639 270 452	639 270 452	98 698 254	0	 100%	 0%	
TOTAL	2 915 079 722	2 135 299 801	555 955 981	102 750 355	 77%	 18%	

	(valores em euros)						
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1] REAL	[2] REAL	[3] PREVISÃO	[4] REAL	[(4)+[2)]/[1]	[4]/[3]	
	Contratado	Acumulado 2025	2026	até jun/26	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	Duodécimo=50%
DGTF	90 000 000	0	0	0	 0%	 -	
BEI	31 304 335	33 913 032	-2 608 697	-2 608 697	 100%	 100%	
BANCA COMERCIAL	83 750 000	85 000 000	-2 500 000	-1 250 000	 100%	 50%	
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	205 054 335	118 913 032	-5 108 697	-3 858 697	 56%	 76%	

	(valores em euros, inc. IVA)						
FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1] PREVISÃO	[2] REAL			[2]/[1]		
	2026	até jun/26			Execução do Orçamento	Duodécimo=50%	
Estado (Comparticipações Tarifárias - GPIAAAF)	2 100 000	0			 0%		
INCENTIVA+TP E OUTRAS COMPENSAÇÕES (TMP)	25 427 607	9 389 059			 37%		
TOTAL	27 527 607	9 389 059					

ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)									
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1] PREVISÃO	[2] PREVISÃO	[3] REAL	[4] REAL	[5] REAL	[4]/[1]		[4]/[3]	
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Lq. de Cativos	Execução até jun/26	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP		Ex. Orçamento de Estado	
RECEITA	703 500 960	432 161 481	524 932 203	261 187 653	0		37%		50%
Impostos Directos	0	0	0	0	0		-		-
Impostos Indirectos	0	0	0	0	0		-		-
Contrib.Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0	0		-		-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	328 096	2 338 597	2 338 597	751 230	0		229%		32%
Rendimentos da Propriedade	0	0	0	1 542	0		-		-
Transferências Correntes	2 100 000	2 100 000	2 100 000	7 411 787	0		353%		353%
Estado (Comparticipações Tarifárias - GPIAAAF)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0		0%		0%
Administração Local (Comparticipações Tarifárias - TMP)	0	0	0	7 411 787	0		-		-
Outras Transferências	0	0	0	0	0		-		-
Venda Bens e Serviços Correntes	98 642 823	99 521 972	99 521 972	31 025 579	0		31%		31%
Aluguer de espaços e equipamentos	1 108 151	1 108 293	1 108 293	488 863	0		44%		44%
TSA	23 766 903	25 700 728	25 700 728	1 977 272	0		8%		8%
Outras (inclui Receita Tarifária)	73 767 769	72 712 951	72 712 951	28 559 444	0		39%		39%
Outras Receitas Correntes (inclui reembolsos IVA)	18 199 293	42 696 144	42 696 144	13 906 819	0		76%		33%
Venda Bens de Investimento	0	0	0	2 270	0		-		-
Transferências de Capital	457 257 727	212 646 214	217 636 237	107 740 377	0		24%		50%
Estado (PIDDAC e OE)	149 651 801	800 000	800 000	466 667	0		0%		58%
Sustentável 2030	89 118 524	89 118 524	89 118 524	17 712 045	0		20%		20%
PRR	198 571 259	105 227 690	110 217 713	89 561 665	0		45%		81%
Fundo Ambiental	19 916 143	17 500 000	17 500 000	0	0		0%		0%
Outras Transferências	0	0	0	0	0		-		-
Outras Receitas de Capital	25 571 454	0	0	0	0		0%		-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	210 333	0		-		-
Activos Financeiros	0	0	86 552 957	98 909 978	0		-		114%
Passivos Financeiros	101 401 569	72 858 554	72 858 554	0	0		0%		0%
Empréstimos (ETF)	2 703 315	2 704 000	2 704 000	0	0		0%		0%
Realizações de Capital (ETF)	98 698 254	70 154 554	70 154 554	0	0		0%		0%
Saldo Gerência Anterior	0	0	1 227 742	1 227 740	0		-		100%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0		-		-
DESPESA	703 500 960	432 161 481	504 680 774	185 121 527	211 543 685		26%		37%
Despesas com Pessoal	6 805 568	6 805 569	6 805 569	3 068 542	3 245 248		45%		45%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	123 027 532	108 103 487	125 820 634	45 649 742	49 235 035		37%		36%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	98 736 808	82 000 879	97 879 553	39 132 278	38 161 970		40%		40%
Outras	24 290 724	26 102 608	27 941 081	6 517 464	11 073 065		27%		23%
Juros e Outros Encargos	3 135 823	3 135 823	3 547 844	2 153 167	1 016 235		69%		61%
Banca Comercial	2 005 014	2 005 014	2 005 014	1 062 470	942 544		53%		53%
ETF	0	0	0	0	0		-		-
BEI	979 408	979 409	979 409	979 408	1		100%		100%
Outras	151 400	151 400	563 421	111 288	73 690		74%		20%
Transferências Correntes	0	0	0	0	0		-		-
Subsídios	0	0	0	0	0		-		-
Outras Despesas Correntes	6 730 475	17 839 435	1 458 140	116 570	1 028 011		2%		8%
Aquis. Bens de Investimento	529 792 866	258 041 286	328 812 706	130 274 810	122 641 972		25%		40%
Santo Ovídio - Vila d'Este (Amarela)	35 623 523	1 090 179	923 317	62 880	75 291		0%		7%
Casa da Música - São Bento (Rosa)	81 176 764	32 349 021	68 597 723	40 982 630	2 816 134		50%		60%
Casa da Música - Santo Ovídio (Rubi)	262 697 980	115 549 839	126 281 588	63 285 545	42 294 434		24%		50%
BRT Boavista - Império - Pç. Cid. Salv.	19 526 731	5 299 614	29 779 805	19 246 931	3 956 737		99%		65%
Gondomar II	20 914 162	18 357 528	18 342 368	12 623	18 061 711		0%		0%
Trofa	20 905 008	20 496 111	19 016 211	688 905	18 284 452		3%		4%
S. Mamede	150 802	133 989	872 961	0	114 013		0%		0%
Maia II	1 396 806	1 241 066	1 966 834	400 892	235 770		29%		20%
3ª Frota	48 061 719	0	139 482	0	0		0%		0%
4ª Frota	32 542 584	31 639 579	32 542 584	3 217 180	22 472 865		10%		10%
Outros	6 796 786	31 884 360	30 349 833	2 377 225	14 330 565		35%		8%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0		-		-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0		-		-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		0%		0%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	33 008 697	37 235 881	37 235 881	3 858 697	33 377 184		12%		10%
Banca Comercial	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	1 250 000		50%		50%
ETF	0	0	0	0	0		-		-
BEI	2 608 697	2 608 697	2 608 697	2 608 697	0		100%		100%
Outras (inclui Conta-Caução USCBL)	27 900 000	32 127 184	32 127 184	0	32 127 184		0%		0%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0		-		-

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	jun/26	[1]		[2]		[3]		[4]		[1]-[3]		[2]-[4]	
		RECEITA		DESPESA				SALDO					
		Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos	Atividade	Projetos
313 - Saldos de RI não afetas a projetos cofinanciados		0	0	0	0			0	0			0	0
316 - Saldos de RI com origem em transferências entre entidades		0	180 230	0	13 778			0	0			166 452	
318 - RI - Indemn. Compens. não afetas a projetos cofina		0	0	0	0			0	0			0	0
319 - Transferências de RI entre organismos		0	466 667	0	308 325			0	0			158 342	
31B - Transferências de RI - PRR - Empréstimos		0	84 903 648	0	63 317 736			0	0			21 585 912	
357 - RI afetas a projetos cofinanciados-PRR		0	0	0	0			0	0			0	0
363 - RP afetas a projetos cofinanciados-FSE		0	0	0	0			0	0			0	0
368 - Saldos de RP afetas a projetos cofinanciados (A)		0	0	0	0			0	0			0	0
412 - Feder - Norte 2020		0	0	0	0			0	0			0	0
432 - Fundo de Coesão - SEUR		0	0	0	0			0	0			0	0
434 - Fundo Coesão PT 2030		0	17 712 045	0	25 138 748			0				-7 426 702	
441 - FSE - Competitividade e Internacionalização		0	0	0	0			0	0			0	0
483 - Instrumento de Recuperação e Resiliência		0	12 025 017	0	2 869 655			0	0			9 155 361	
484 - PRR - Subvenções IVA		0	0	0	0			0	0			0	0
488 - Saldos de Fundos Europeus		0	3 864 102	0	0			0	0			3 864 102	
48A - Saldos de PRR - Subvenções		0	4 990 022	0	3 180 451			0	0			1 809 571	
513 - RP do ano - com outras origens		39 509 045	13 800 513	48 484 929	5 947 109			-8 975 884				7 853 404	
521 - RG - Com origem em RG provenientes do OE (A)		0	0	0	0			0	0			0	0
522 - Saldos de RP transitados - com outras origens		15 878 674	67 857 690	0	21 674 822			15 878 674	46 182 867				
540 - Transferências de RP entre organismos - FA		0	0	0	0			0	0			0	0
541 - Transferências de RP entre organismos		0	0	0	6 308 216			0				-6 308 216	
713 - Entidade da A.C. - Com origem em receitas gerais		0	0	0	0			0	0			0	0
721 - Entidade da AC - Com origem receitas de impostos		0	0	0	7 877 758			0				-7 877 758	
